



# ACUSE

Cd. Juárez, Chih., a 04 de febrero de 2016.  
Oficio No. 096 – Rectoría / Planeación.

**Dr. Salvador Malo Álvarez**  
**Director General de Educación Superior Universitaria**  
**Subsecretaría de Educación Superior**  
**Presente.-**




Por medio de este conducto reciba un saludo y al mismo tiempo le hacemos llegar los informes de Avance de Obras Apoyadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015, correspondiente al mes de enero del 2016.

Cabe aclarar que la versión electrónica del mencionado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

julieta.nishisawa@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx,  
centrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, icarlosv@nube.sep.gob.mx

Hago el momento propicio para manifestarle la seguridad de mi consideración.



**Atentamente**  
"POR UNA VIDA CIENTÍFICA,  
POR UNA CIENCIA VITAL"

**Lic. Ricardo Duarte Jáquez**  
**Rector**

Ccp: M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional.  
Mtra. María del Rocío Chávez, Subdirectora de Programas de Apoyo.



*Rectoría*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE  
 Autorización de infraestructura física  
 en el marco del PIFI v. 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015  
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución  
 Nombre de la institución:  
 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
 Entidad federativa:  
 Chihuahua  
 ClaveInst 911  
 08MSU0245B

DATOS GENERALES DE LA OBRA		CONSTRUCCIÓN																																	
Prioridad	Descripción de la obra	Aleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	
1	Edificio Multifuncional I1 en el IADA	233			9	126																			8	469	6	116	10	77	Cuarto de aseo Cuartos de tableros Cuartos de comunicaciones Área de descanso	43.00	1,288	20,999,352.00	
2	Edificio D en DM de Cuauhtémoc																								5	408	4	93	10	77	Cuarto de aseo Cuartos de tableros Cuartos de comunicaciones Área de descanso Bodega Elevador	33.00	1,219	20,000,000.00	
TOTAL		233.20			9.00	125.69																			13.00	876.89	10.00	209.23	20.00	154.79		76.00	2,506.94	40,999,352.00	

**INFORME DE AVANCE DE  
OBRAS FINANCIADAS  
CON RECURSOS DEL  
FAM 2015**

**Enero del 2016.**



## **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

Ricardo Duarte Jáquez  
*Rector*

Rita Ileana Olivas Lara  
*Directora General de Servicios Administrativos*

Ángel Fernando Gómez Martínez  
*Director General de Planeación y Desarrollo Institucional*

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Av. Plutarco E. Calles núm. 1210  
Fovissste Chamizal, código postal 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional.

# FAM 2015

---


De acuerdo al Plan Maestro de Construcción en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015 se hizo la solicitud para la construcción de un edificio Multifuncional en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA) edificio I1, y otro en la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc el edificio D.

Estas obras tienen una superficie total de 2,506.94m<sup>2</sup> de construcción y un costo de \$40,999,352.00


# FAM 2015

---

Respecto al Edificio Multifuncional I1 en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte. Actualmente se encuentra en proceso de construcción se tiene un avance de obra que corresponde al 3%. El avance financiero representa un 27%. Representa el pago del 30% de anticipo.

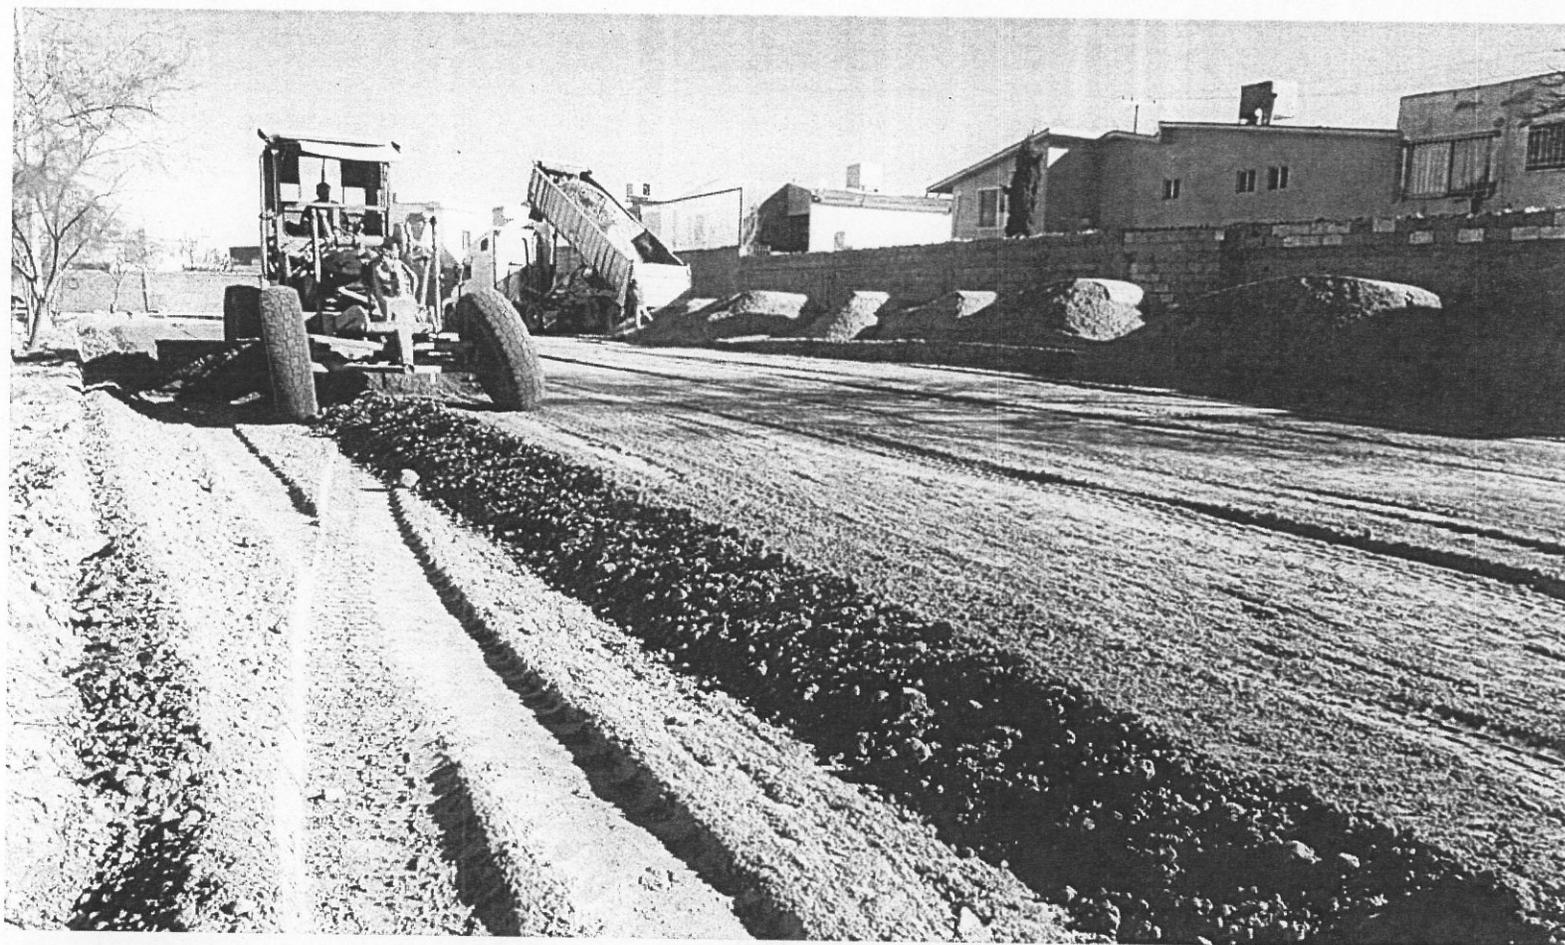

**Construcción del edificio I1.**

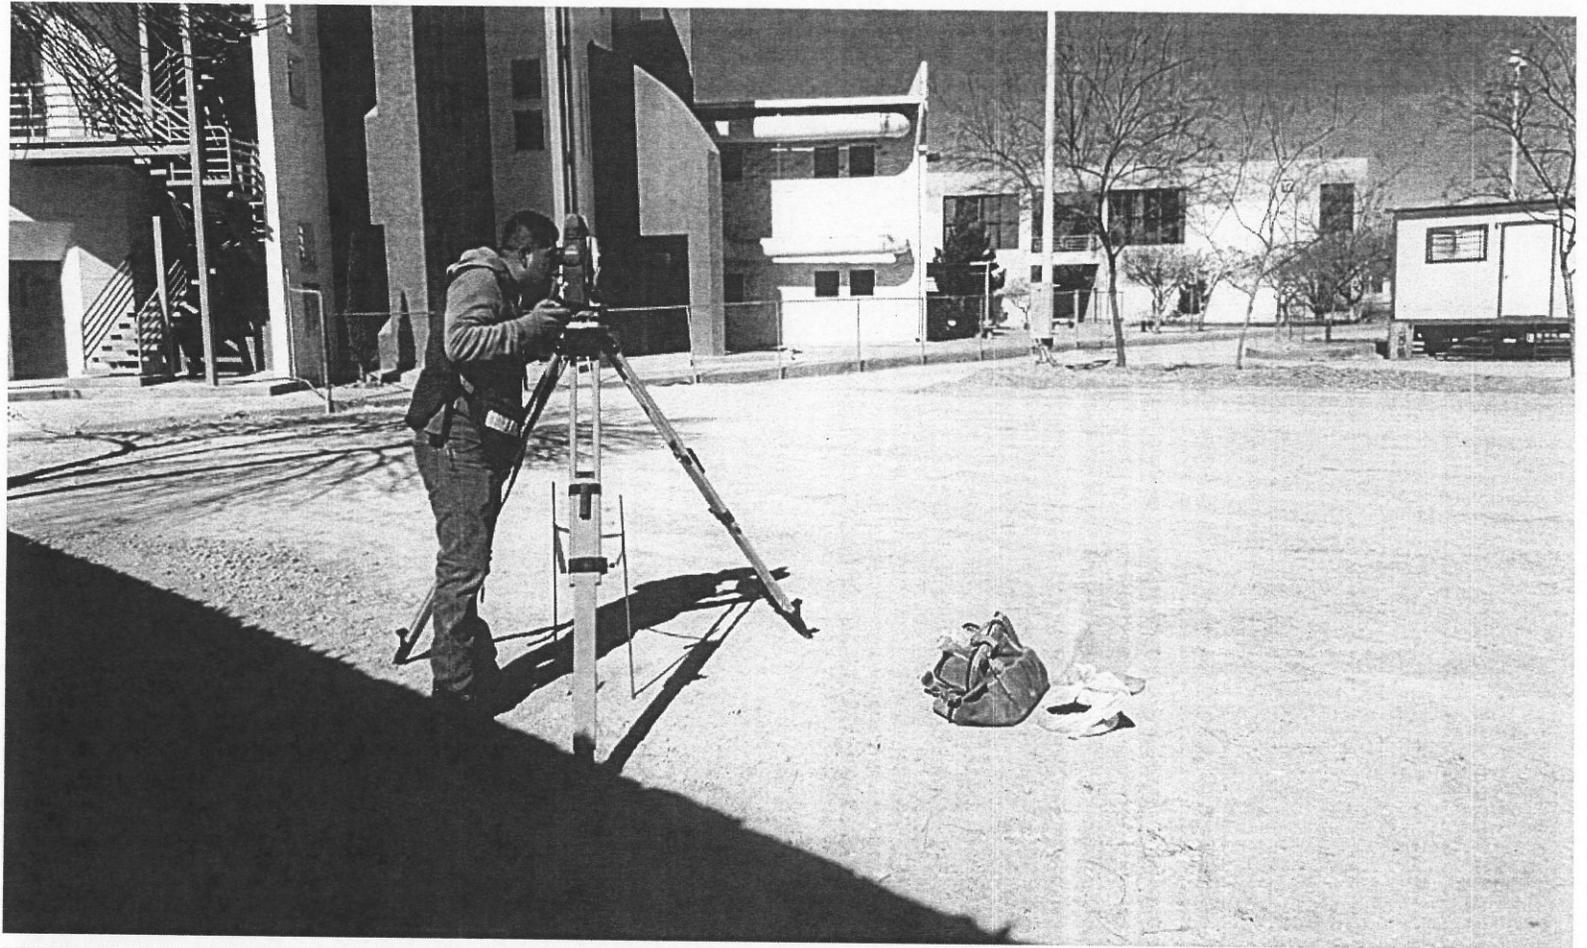


## Construcción del edificio I1.


# FAM 2015

---

Respecto al Edificio Multifuncional D en el Campus de Cuauhtémoc. Actualmente se encuentra en proceso de construcción se tiene un avance de obra que corresponde al 4%. El avance financiero representa un 29%. Representa el pago del 30% de anticipo.

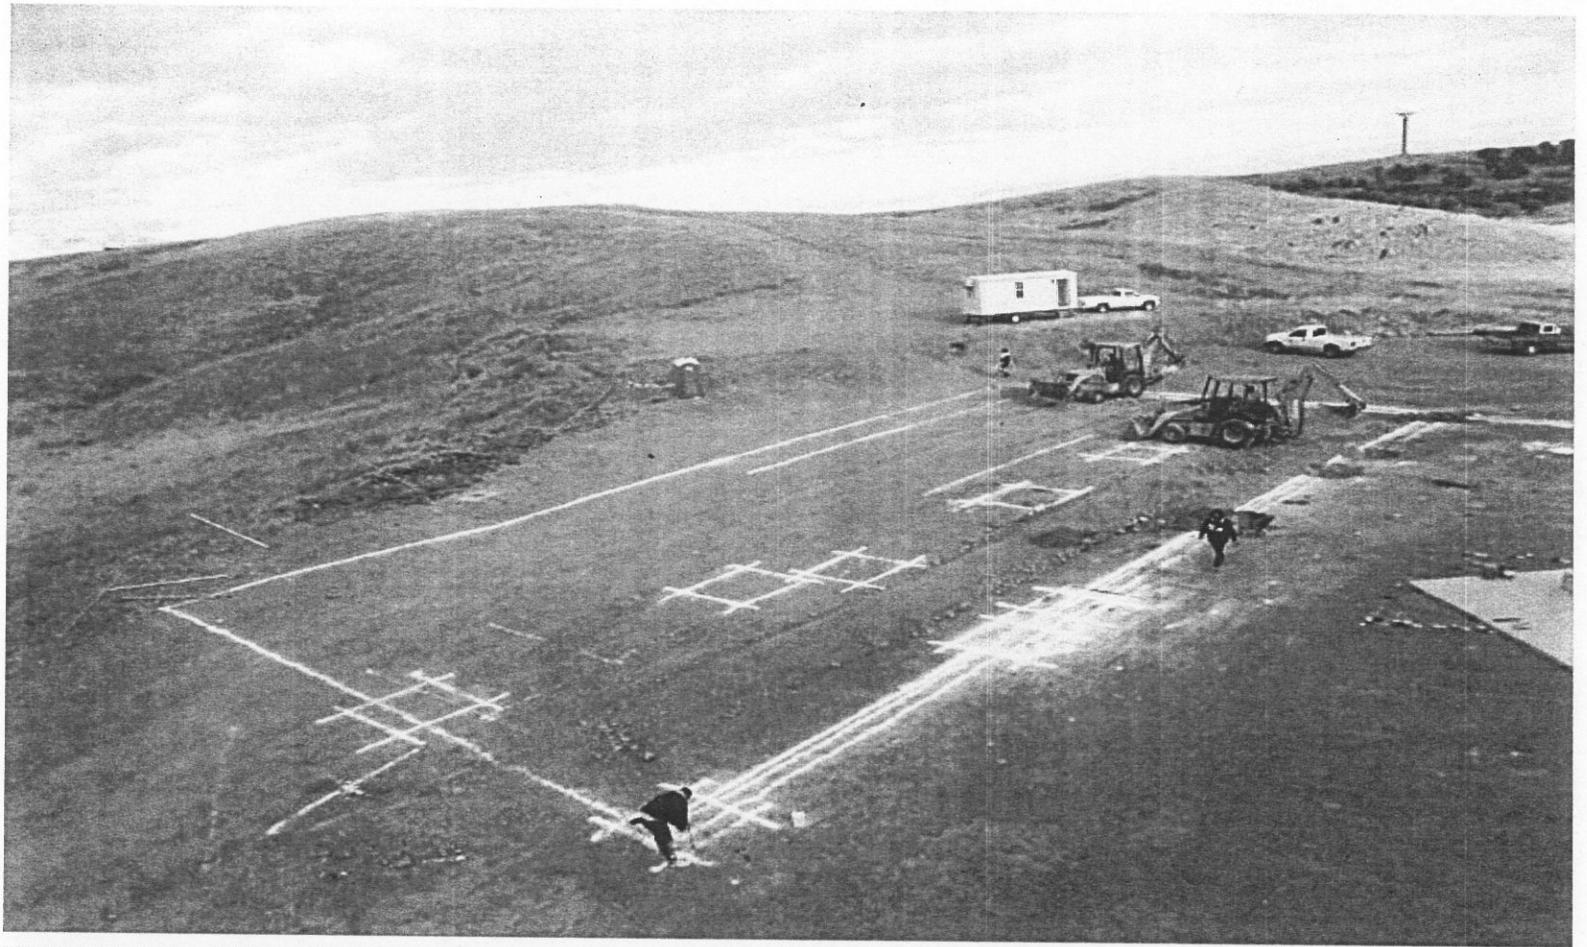

## Construcción del Edificio Multifuncional D .

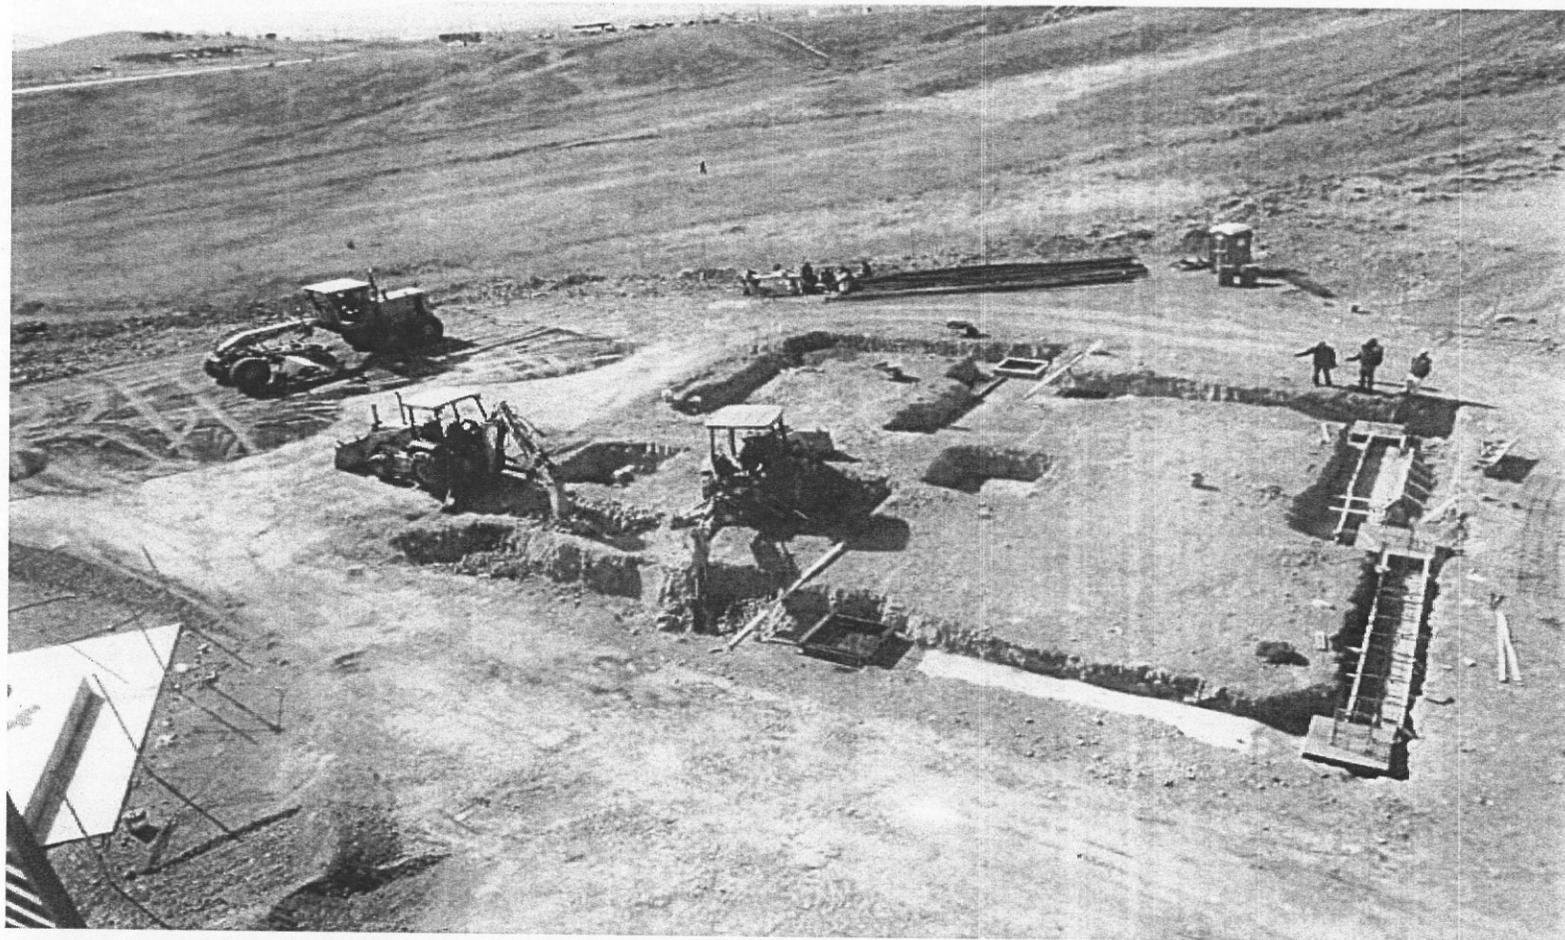

## Construcción del Edificio Multifuncional D.

# Resumen

Año Correspondiente a FAM	Obra	Inversión FAM (en millones de pesos)	Inversión UACJ (en millones de pesos)	Avance Financiero (respecto a FAM)	Avance Físico
2015	Construcción del edificio multifuncional del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (Edificio I1)	\$ 20,999	-	27%	3.0%
2015	Construcción del edificio D en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc, Chihuahua	\$ 20,000	-	29%	4.0%



Gracias por su atención.
