



Cd. Juárez, Chih., a 7 de junio de 2018.
Oficio No. 259 – Rectoría / Planeación.

Ing. Arturo Fuentes Vélez
Secretaria de Hacienda
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de mayo de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ



ACUSE

Cd. Juárez, Chih., a 7 de junio de 2018.
Oficio No. 259 – Rectoría / Planeación.

Ing. Arturo Fuentes Vélez
Secretaría de Hacienda
Presente.-

En atención al oficio No. SH/0209/2018, le hago llegar la información relacionada con la inversión aprobada y ejercida en el formato "Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones" de esta Universidad correspondiente al mes de mayo de 2018.

En espera de que esta información sea de utilidad, quedo de usted.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTIFICA
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ



Dependencia: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 y Recursos Propios (UAGC)

FECHA DE CORTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	Programa / Subprograma	No. de Obra ^a	Nombre de la Obra	Breve Descripción de la Obra	Municipio / Localidad	Oficio Aprobación	Fecha de		Inversión Aprobada				
								Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	UAGC (Reporte UAGC)
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707760	Ampliación y Remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto. Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	16,731,538.65	\$8,031,647.00			\$8,699,891.65
31/mayo/2018	2018	Infraestructura Educativa / Construcción	23707761	Ampliación y Remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Ampliación y Remodelación de de Edificio de dos niveles a base de Estructura Metálica y Estructura de Concreto. Instalaciones Generales, Acabados en General y Obra Exterior.	Juárez / Cd. Juárez	2018-SK01718-A-0744	Feb-18	Sep-18	15,757,490.49	\$9,000,000.00			\$6,757,490.49
SUMA TOTAL										32,489,029.14	17,031,647.00			15,457,382.14

Lic. Ricardo Parra Juárez

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Reporte Mensual de Avances de Obra, Adquisiciones y/o Acciones



Fecha de elaboración 7 de junio de 2018

Total	Inversión Ejercida				Saldo				Avance %		Metas Totales del Proyecto		Comentarios	
	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Financiero	Físico	Programadas		Alcanzadas
11,149,364.37	\$9,051,647.00			\$3,117,717.37	5,582,174.28	-	-	-	5,582,174.28	67%	67.0%	66.0%	67.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 4 estimaciones.
12,346,490.89	\$9,000,000.00			\$3,346,490.89	3,410,999.60	-	-	-	3,410,999.60	78%	79.0%	75.0%	79.0%	Obra en proceso de construcción. El avance financiero representa el pago del 30% anticipo y pago de 6 estimaciones.
23,495,855.26	17,031,647.00			6,464,208.26	8,993,173.88	-	-	-	8,993,173.88					

RESUMEN

REPORTE FOTOGRÁFICO EDIFICIO "B" EN CAMPUS ICB

REPORTE MENSUAL AVANCE DE OBRA MAYO 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Nombre del Proyecto:	REMODELACIÓN DE EDIFICIO "B" EN CAMPUS ICB
Porcentaje de Avance Físico:	79.10%

Enlace con la Dirección de Programas de Inversión de esta Secretaría de Hacienda

Nombre:	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Cargo:	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono:	(656) 688-21-31 y (656) 688-21-36
Correo electrónico:	agomez@uacj.mx



13 FACHADA PRINCIPAL

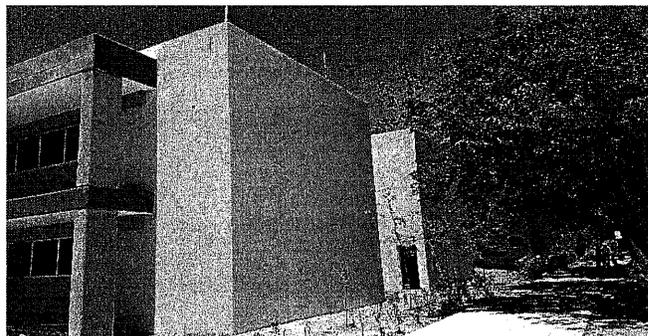


14.1 FACHADA LATERAL DERECHA




14.2 FACHADA LATERAL IZQUIERDA




15 FACHADA POSTERIOR

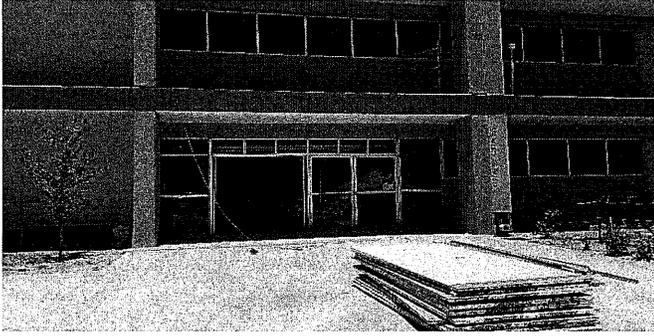

16 ENTRADA PRINCIPAL

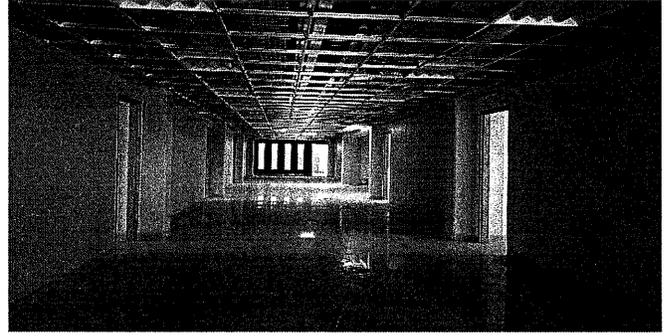


17.1 INTERIORES





17.2 INTERIORES



17.3 INTERIORES

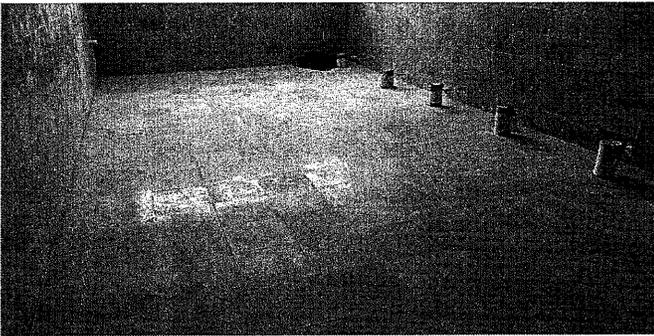

17.4 INTERIORES

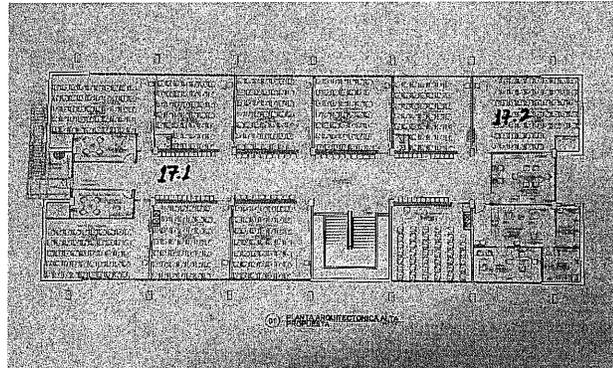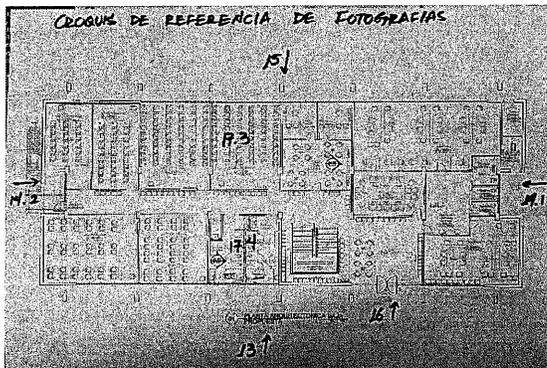

CROQUIS DE REFERENCIA DE UBICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS


REPORTE FOTOGRÁFICO EDIFICIO "C" EN CAMPUS ICSA

REPORTE MENSUAL AVANCE DE OBRA MAYO 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre del Proyecto: **REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO "C" EN CAMPUS ICSA**
Porcentaje de Avance Físico: **66.92%**


Nombre:	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Cargo:	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono:	(656) 688-21-31 y (656) 688-21-36
Correo electrónico:	agomez@uacj.mx

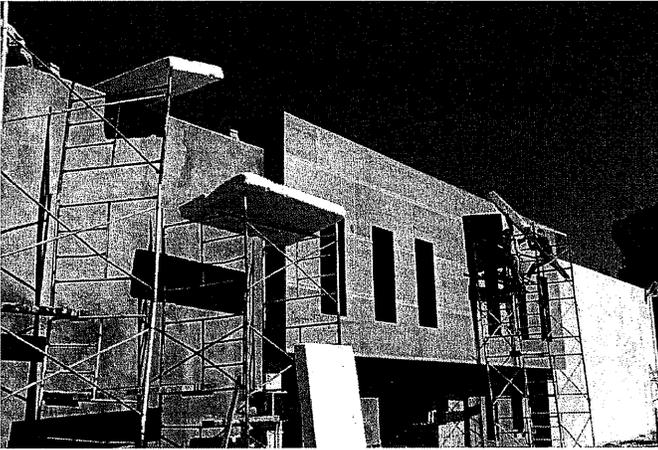


FACHADA PRINCIPAL




FACHADA LATERAL DERECHA

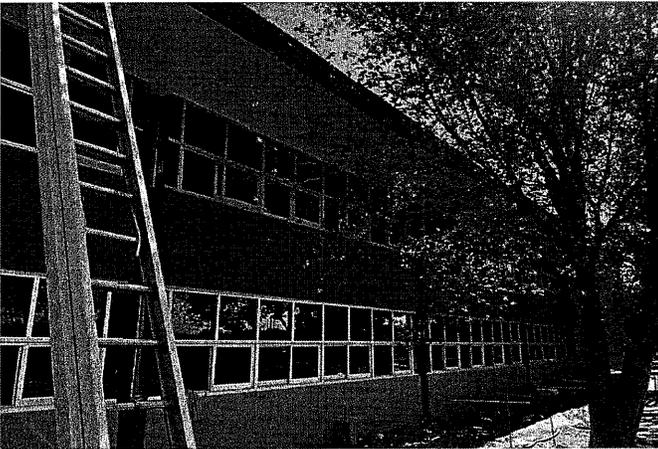


FACHADA LATERAL IZQUIERA

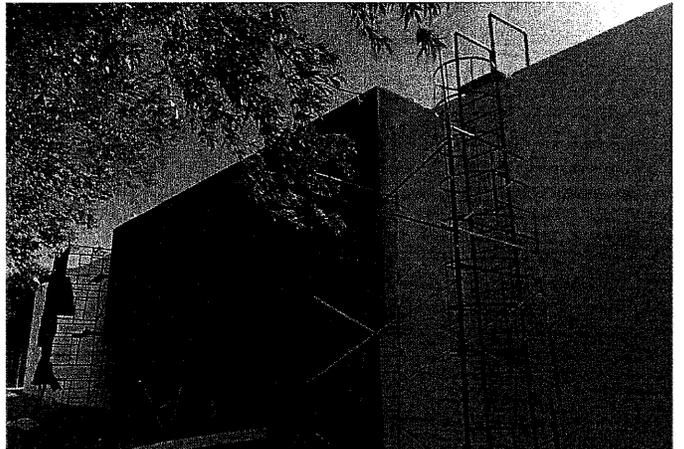


FACHADA POSTERIOR

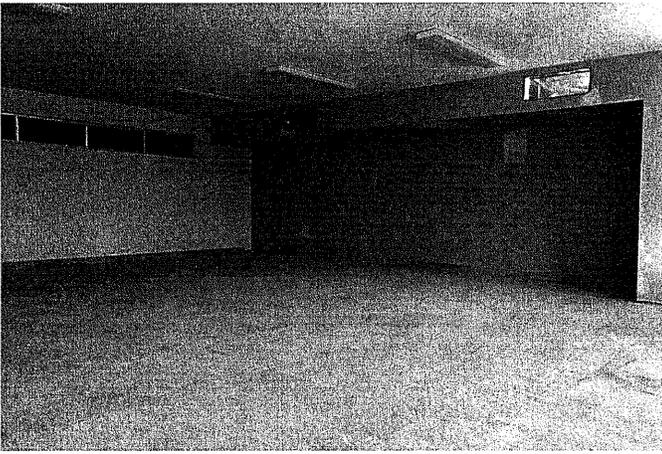

INTERIOR 1

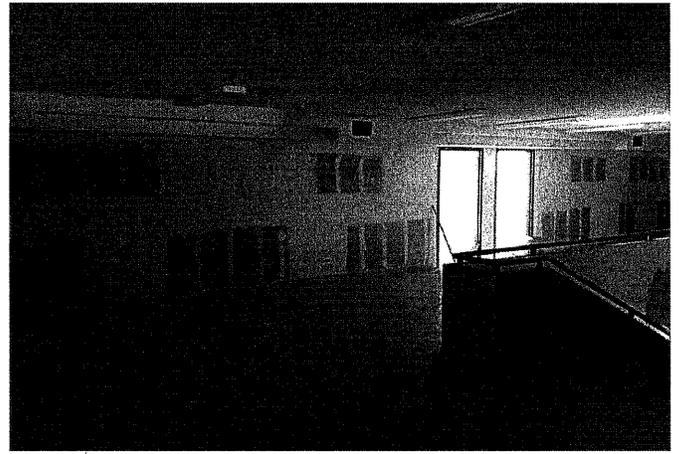


INTERIOR 2

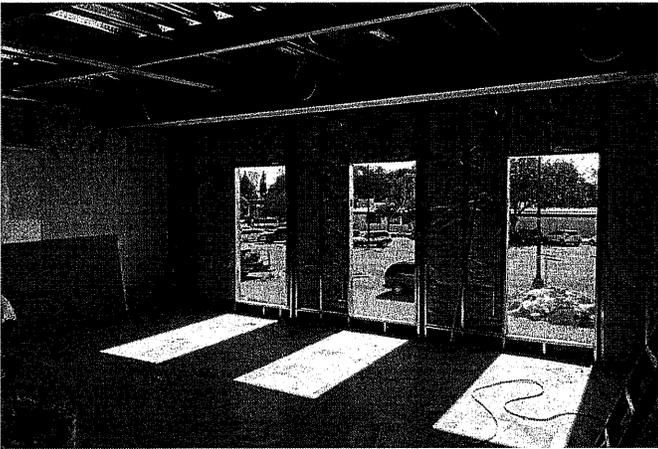

INTERIOR 3

INTERIOR 4

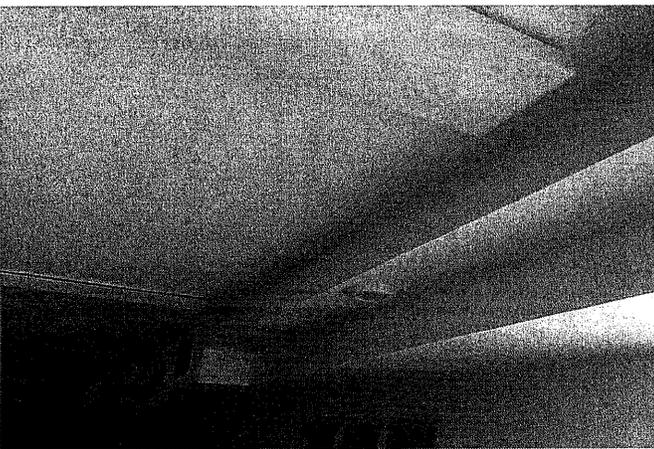

INTERIOR 5



INTERIOR 6
