



Ciudad Juárez, Chih., a 7 de enero 2020.
Oficio No 10 – Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (diciembre) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de diciembre del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.



Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”


Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Diciembre 2019
 FECHA DE CORTE: 31/12/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Entidad federativa: Chihuahua
 Clave Inst 911: 08MSU0245B



RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 683-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			
		Otra de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantiable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	x				\$ 17,268,254.09	\$ 17,268,254.09	\$	Aulas: 16, 1063.17 Auditorio: 1, 120.00 Oficinas académicas: 4, 200.00 Oficinas administrativas: 3, 150.00 Sanitarios: 2, 150.00 Áreas comunes: 2, 350.00 TOTAL: 28, 2033.17	Trabajos de jardinería en obra exterior, fabricación de escalera de emergencia, herrería, instalación de cancelería interior y exterior, colocación de puertas de carpintería, muebles sanitarios, mamparas metálicas para baños, 2da mano de pintura interior y exterior, instalación de cerámica en pisos de auditorio, limpieza gruesa y fina.	n/a	100.00%	14-06-19	30-12-19	La obra se encuentra en proceso de cierre de administrativo. NOTA: a la fecha se ha pagado un total de \$19,089,211.79 M.N. de los cuales \$17,268,254.09 M.N. corresponden al FAM							
						\$17,268,254.09	\$17,268,254.09	\$0.00														

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
 Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO DE AVANCE RENOVAL


1 Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**




Presupuesto de avance

100

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

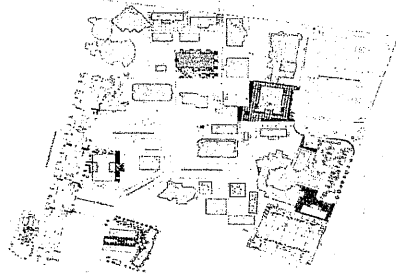

Planta de Contexto

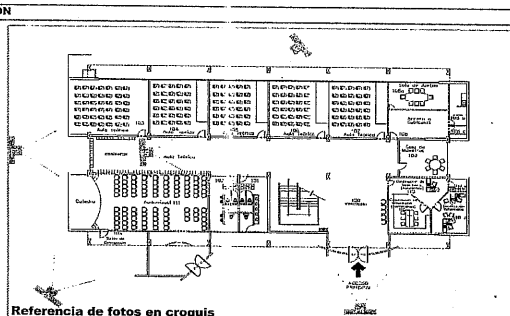


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651

FOTOS

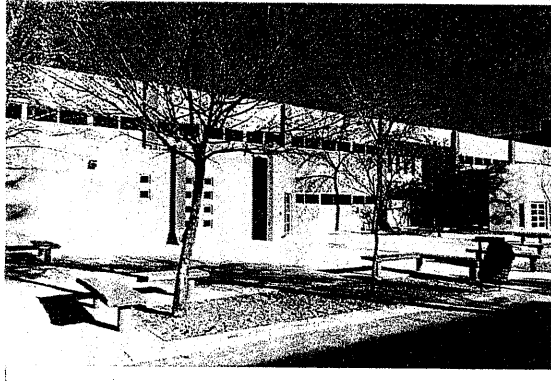


F1 Fachada principal

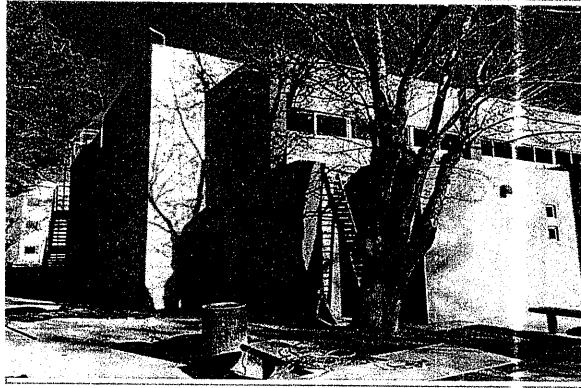

F2

Comentarios de los trabajos realizados:


Se trabaja en jardinería de obra exterior, fabricación de escalera de emergencia, herrería, instalación de cancelería interior y exterior, colocación de puertas de carpintería, muebles sanitarios, mamparas para baños, 2da mano de pintura interior y exterior, instalación de cerámica en pisos de audiovisual, limpieza gruesa y fina.

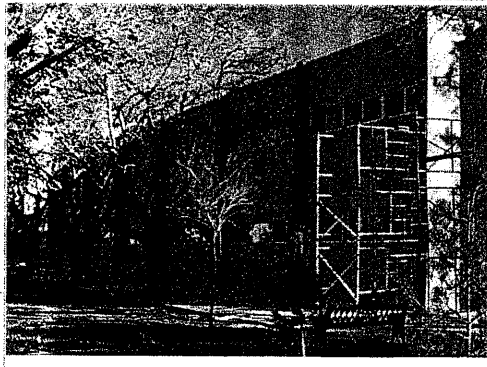

F3 Fachada posterior



F4

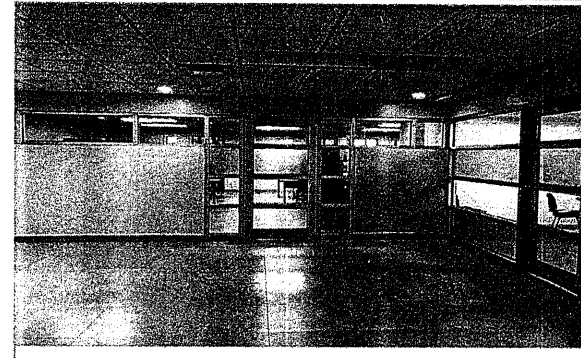

F5

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
