



Ciudad Juárez, Chih., a 7 de junio de 2019.
Oficio No. 187– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (mayo) FAM 2019.

Dr. Isaiás Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de mayo del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”



Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Rectoría

Mmears/liba

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019



Mes reportado

Mayo 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 688-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	x				\$ 17,268,254.09	\$ -	\$ 17,268,254.09	Aulas	16	1063.17	• Se ha realizado la gestión del recurso ante Gobierno del Estado de Chihuahua. • Se ha realizado la licitación y adjudicación de la obra.	• En proceso la realización del contrato de obra • Dar inicio formal a los trabajos de remodelación	0	24/06/2019	15/12/2019	SÍ						
								Auditorio	1	120.00													
								Oficinas académicas	4	200.00													
								Oficinas administrativas	3	150.00													
								Sanitarios	2	150.00													
								Áreas comunes	2	350.00													
								TOTAL	28	2033.17													
						\$17,268,254.09	\$0.00	\$17,268,254.09															


Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
 Nombre y firma del Titular de la IES


Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo_2019

FECHA DE CORTE: 31/05/19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRORIDAD

1


Nombre de la obra:

Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

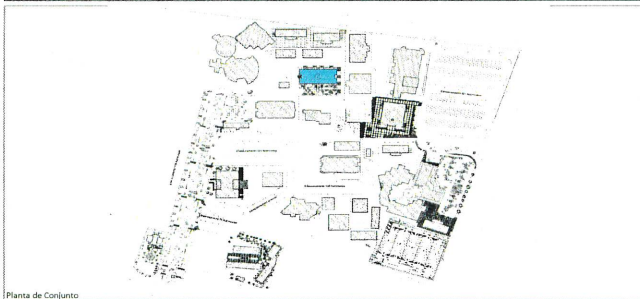

Planta de Conjunto

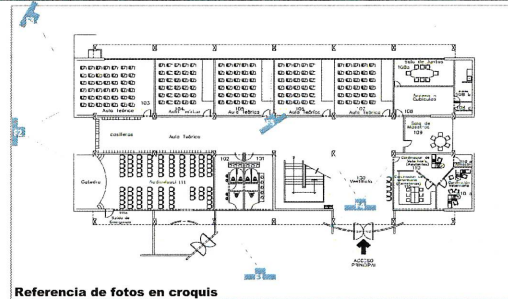

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Las imágenes corresponden al estado actual en la que se encuentra la obra a realizar.



F3: Fachada posterior

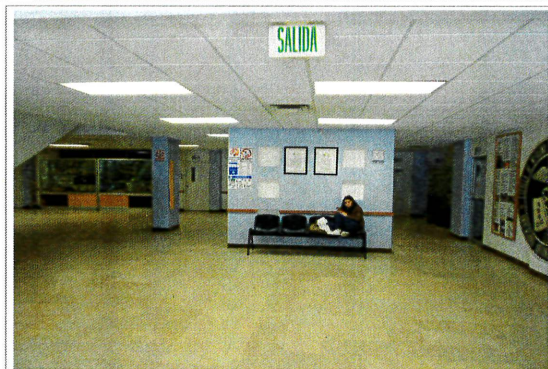

F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
