



Ciudad Juárez, Chih., a 10 de julio de 2019.
Oficio No. 201– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (junio) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de junio del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”



Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • C. P. 32310 • A. P. 100 • Ciudad Juárez, Chih., México
Teléfonos: (656) 688 2110 y 688 2111 • Fax (656) 688 2118 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas 79994

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio_2019
 FECHA DE CORTE: 30/06/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 688-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obra de continuación	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	X				\$ 17,268,254.09	\$ 5,837,420.07	\$ 11,430,834.02	Aulas	16	1063.17	• Se dió inicio al proceso de preparación de las superficies (limpieza y retiro de los materiales constructivos actuales).	• Se continuará con el proceso de limpieza y retiro de los materiales anteriores para la preparación de la superficie a remodelar durante el mes de julio.	10	14-06-19	15/12/2019	S/O						
								Auditorio	1	120.00													
								Oficinas académicas	4	200.00													
								Oficinas administrativas	3	150.00													
								Sanitarios	2	150.00													
								Áreas comunes	2	350.00													
								TOTAL	28	2033.17													
						\$17,268,254.09	\$5,837,420.07	\$11,430,834.02															

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
 Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

10


PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

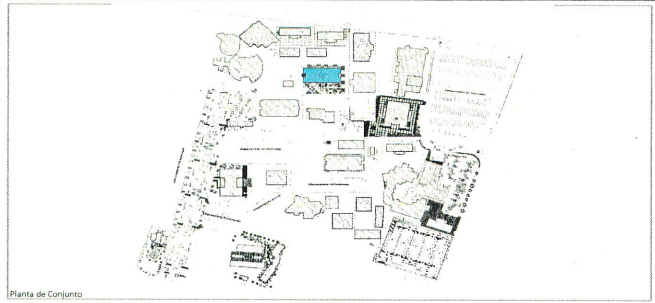

Planta de Conjunto

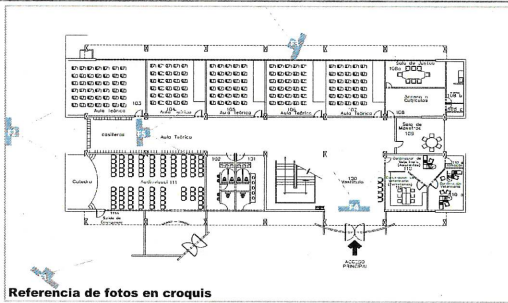

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamin Franklin 4651

FOTOS



F1: Fachada principal

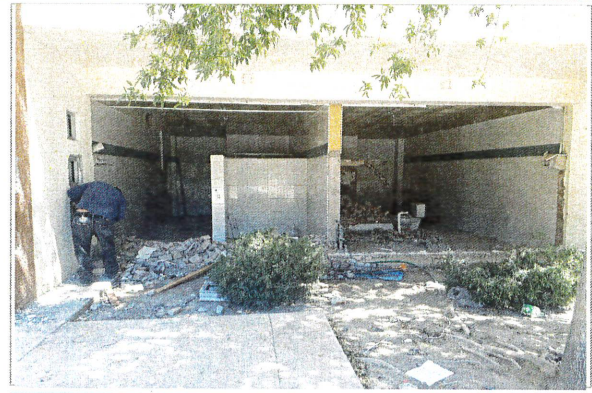

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La obra se encuentra en trabajos de remoción de los materiales para preparar superficies.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
