



Ciudad Juárez, Chih., a 8 de abril de 2019.
Oficio No. 105– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (marzo) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de marzo del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Hago el momento propicio para mencionarle que el recurso correspondiente a FAM 2018 en beneficio de esta universidad, se ha ejercido en tiempo y forma. Los finiquitos de las obras se notificaron de manera oficial (a través del comunicado No. 433) en el mes de septiembre del 2018. Se anexa una copia del mismo.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

**“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”**

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional.
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

FAM

Mes reportado

Marzo_2019

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MNSU2458



Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Ma. Esther Means Delgado

Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 656-6-86-21-31 656-6-86-21-36

Correo electrónico: mmeans@uacj.mx

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Cargo: Director General de Servicios Administrativos

Teléfono: (656) 688-21-40

Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y lino de proyecto ¹		Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Acta de Entrega Administrativa y Recepción	Monto de Acta Administrativa
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipos				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término		
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)		X			\$ 17,268,254.09	\$ -	\$ 17,268,254.09	Aulas	16	1063.17					-Se encuentra en proceso de gestión del recurso ante Gobierno del Estado de Chihuahua					
									Auditorio	1	120.00										
									Oficinas académicas	4	200.00										
									Oficinas administrativas	3	150.00										
									Sanitarios	2	150.00										
									Aulas comunes	2	350.00										
									TOTAL	28	2033.17										
						\$17,268,254.09	\$0.00	\$17,268,254.09													

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado
Marzo 2019
FECHA DE CORTE: 31/03/19



Porcentaje de avances



0

Proyecto No. 1 Nombre de la obra:

Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)

REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE MENSUAL
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

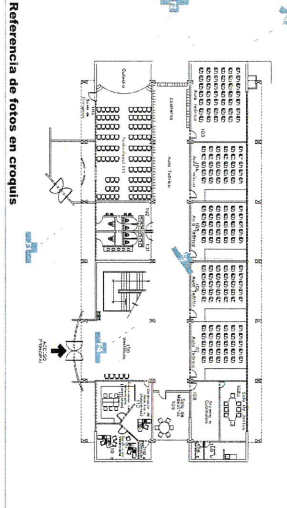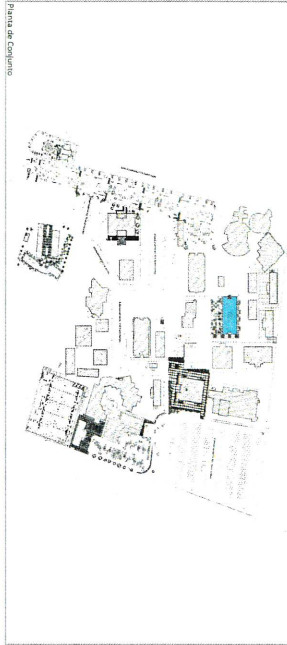

Referencia de fotos en croquis

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior

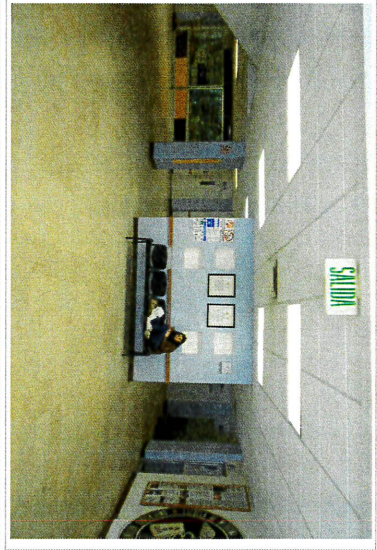

F4: Entrada

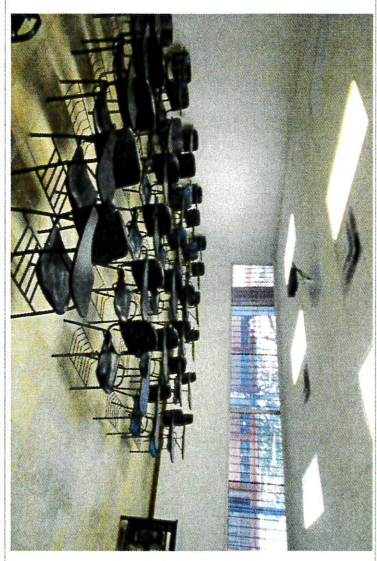

F5: Interior de aula 1

Comentarios de los trabajos realizados:

Las imágenes corresponden al estado actual en la que se encuentra la obra a realizar.


Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Cd. Juárez, Chih. a 06 de septiembre de 2018.
Oficio No. 433 – Rectoría / Planeación

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Presente.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, hacemos llegar los finiquitos de la obras de Ampliación y Remodelación de los Edificios C del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y el B del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), detallado en el Informe del mes de Agosto del 2018 como obras ya concluidas, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

"POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL"

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector



Recibi 10 y 4 de los



Ccp: Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional.
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.



Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

23707760

Siendo las 12:00 horas del día 27 de agosto de 2018, se reunieron el Ing. Rafael Woo Chew, Director de Infraestructura Física, el Arq. José Fernando Villa Guerrero, Subdirector de Construcción, el Arq. José Antonio Hernández Zamora, Supervisor de Obra de la UACJ y el Ing. Víctor Jesús Elías Ríos de la empresa, Ingeniería en Manufacturas y Servicios, S.A. de C.V., en sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Ampliación y Remodelación del Edificio C de ICESA	23707760		X	07-febrero-2018	27-agosto-2018

Obra de continuidad	SI ()	NO (X)
Etapas Número	NA	

SEDE DE LA OBRA

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300	Ciudad Juárez	Juárez	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	Instituto de Ciencias Sociales y Administración

TRABAJO EJECUTADO

Construcción, nueva obra	
Remodelación/Adecuación/Ampliación	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA


Descripción	Número
Aulas/Salones	20
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	6
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	2
Oficinas administrativas	6
Áreas comunes	7
Otros	7

RECURSOS FAM


A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2018
Monto aportado por el FAM	\$ 8,031,674.00
Monto total ejercido del FAM	\$ 8,031,674.00
Remanente	\$ -
Costo total de la Obra	\$ 18,839,020.83
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	\$ 8,031,674.00
Total aportado por FAM	\$ 8,031,674.00
Costo total de la Obra	\$ 18,839,020.83
Total metros cuadrados de la obra	2131.75

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Víctor Jesús Elías Ríos de la empresa, Ingeniería en Manufacturas y Servicios, S.A. de C.V., hace entrega de la misma al Ing. Rafael Woo Chew, Director de Infraestructura Física, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.


Entrega


 Ing. Víctor Jesús Elías Ríos
 Ingeniería en Manufacturas y Servicios, S.A. de C.V.

Recibe


 Ing. Rafael Woo Chew
 Director de Infraestructura Física

Testigo


 Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández
 Contraloría General UACJ



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

23707761

Siendo las 12:00 horas del día 30 de agosto de 2018, se reunieron el Ing. Rafael Woo Chew, Director de Infraestructura Física, el Arq. José Fernando Villa Guerrero, Subdirector de Construcción, el Ing. Erick Francisco Toca Rodríguez, Supervisor de Obra de la UACJ y el Ing. Miguel Ángel Moriel Chaparro de la empresa, Moriel Diseños y Construcciones, S.A. de C.V., en sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Ampliación y Remodelación del Edificio B de ICB	23707761		X	07-febrero-2018	30-agosto-2018

Obra de continuidad	SI ()	NO (X)
Etapas Número	NA	

SEDE DE LA OBRA

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Av. Benjamín Franklin no. 4650 Zona PRONAF CP 32315	Ciudad Juárez	Juárez	08USU4983H	Instituto de Ciencias Biomédicas	Instituto de Ciencias Biomédicas

TRABAJO EJECUTADO

Construcción, nueva obra	
Remodelación/Adecuación/Ampliación	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA

Descripción	Número
Aulas/Salones	16
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	5
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	7
Áreas comunes	7
Otros	5

RECURSOS FAM


A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2018
Monto aportado por el FAM	\$ 9,000,000.00
Monto total ejercido del FAM	\$ 9,000,000.00
Remanente	\$ -
Costo total de la Obra	\$ 16,742,207.44
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	\$ 9,000,000.00
Total aportado por FAM	\$ 9,000,000.00
Costo total de la Obra	\$ 16,742,207.44
Total metros cuadrados de la obra	1895.39

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Ing. Miguel Ángel Moriel Chaparro de la empresa, Moriel Diseños y Construcciones, S.A. de C.V., hace entrega de la misma al Ing. Rafael Woo Chew, Director de Infraestructura Física, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega


Ing. Miguel Ángel Moriel Chaparro
Moriel Diseños y Construcciones, S.A. de C.V.

Recibe


Ing. Rafael Woo Chew
Director de Infraestructura Física

Testigo


Mtro. Eduardo Arturo Lara Hernández
Contraloría General UACJ
