



Ciudad Juárez, Chih., a 5 de diciembre de 2019.  
Oficio No 407– Rectoría / Planeación.  
Asunto: Informe mensual (noviembre) FAM 2019.

**Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Presente. -**

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de noviembre del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

[isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx), [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx),  
[cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx),

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

**Atentamente**

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,  
POR UNA CIENCIA VITAL”

  
**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
**Rector**

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre\_2019**  
 FECHA DE CORTE: 30/11/19

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B



RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 688-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	Cuenta con Actas					
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio		Término	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién cuando inauguro?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	x				\$ 17,268,254.09	\$ 17,268,254.09	\$ -	Aulas	16	1063.17	Banquetas de obra exterior, instalación de difusores y rejillas de clima, herrería, instalación de cancelería interior y exterior, colocación de suspensión y placas de plafón relictular, instalación de loseta y zócalo de cerámica en pisos, dar 2da mano de pintura en interior y 1ra en exterior, instalación de luminarias interiores y exteriores, contactos y apagadores.	n/a	95.70%	14-06-19	30-12-19	En este periodo se ejecutaron las partidas: acabados, herrería, vidrios y cancelas, carpintería, clima, instalación eléctrica, obra exterior.  NOTA: a la fecha se ha pagado un total de \$19,089,211.79 M.N. de los cuales \$17,268,254.09 M.N. corresponden al FAM						
								Auditorio	1	120.00													
								Oficinas académicas	4	200.00													
								Oficinas administrativas	3	150.00													
								Sanitarios	2	150.00													
								Áreas comunes	2	350.00													
								<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>2033.17</b>													
						<b>\$17,268,254.09</b>	<b>\$17,268,254.09</b>	<b>\$0.00</b>															

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
 Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre\_2019**  
FECHA DE CORTE: 30/11/19

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

1


Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**




Porcentaje de avance

**95.7**

Planta de Conjunto

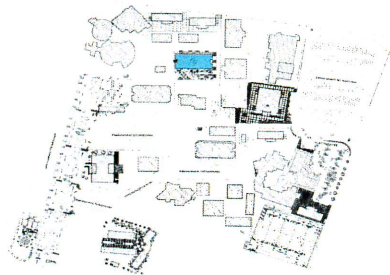

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

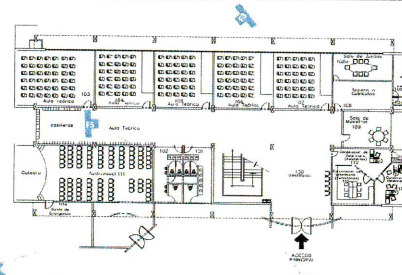

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en banquetas de obra exterior, instalación de difusores y rejillas de clima, herrería, instalación de cancelería interior y exterior, colocación de suspensión y placas de plafón reticular, en instalación de loseta y zoclo de cerámica en pisos y en muros de baños, se trabaja en 2da mano de pintura en muros interiores y primera mano muros exteriores, se trabaja en instalación de luminarias interiores y exteriores, contactos y apagadores.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
