



Ciudad Juárez, Chih., a 5 de noviembre de 2019.
Oficio No 382– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (octubre) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de octubre del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”



Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Rectoría

Mmears/liba

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre_2019
FECHA DE CORTE: 31/10/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B



RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado

Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36

Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Cargo: Director General de Servicios Administrativos

Teléfono: (656) 688-21-40

Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	x				\$ 17,268,254.09	\$ 15,808,303.89	\$ 1,459,950.20	Aulas	16	1063.17	UNIDADES DE CLIMA, INSTALACION DE CANCELERIA, PINTURA EN MUROS, COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA, COLOCACION DE SISTEMAS DE DUCTOS Y DIFUSORES, APLANADO DE MUROS PERIMETRALES, TUBERIA HIDROSANITARIA, INSTALACION DE LUMINARIAS Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS, COMUNICACION Y TABLEROS ELECTRICOS Y BANQUETAS DE OBRA EXTERIOR	n/a	76.30%	14-06-19	30-12-19	EN ESTE PERIODO SE EJECUTAN LAS PARTIDAS: CANCELERIA, ACABADOS, MUROS Y PLAFONES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS					
						\$17,268,254.09	\$15,808,303.89	\$1,459,950.20	TOTAL	28	2033.17											


Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES


Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

1

Nombre de la obra:

Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)




Porcentaje de avance


76.3

Planta de Conjunto

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

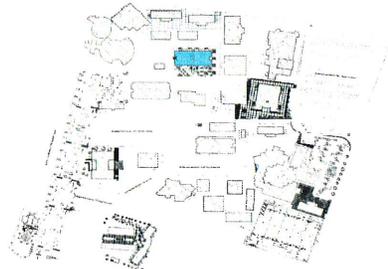


Referencia de fotos en croquis

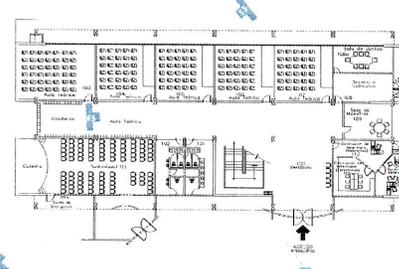

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamin Franklin 4651

FOTOS

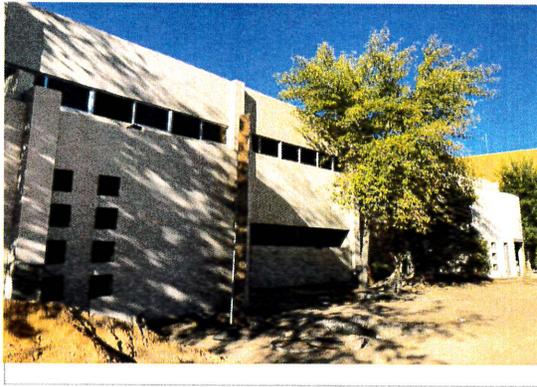


F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en banquetas de obra exterior, instalación de unidades de clima y ductos, instalación de cancelería, se trabaja en fabricación de plafón reticular, se trabaja en instalación de loseta de cerámica en pisos y en muros de baños, se trabaja en primera mano de pintura en muros interiores, se trabaja en instalación de luminarias, cableado de salidas eléctricas y de comunicación.

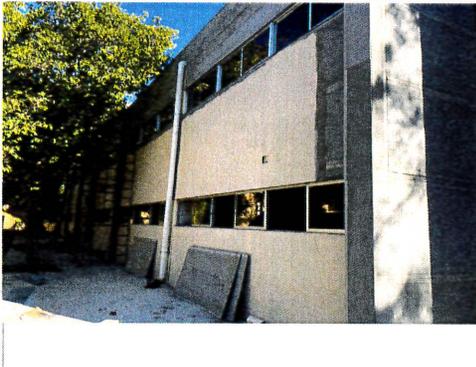

F3: Fachada posterior

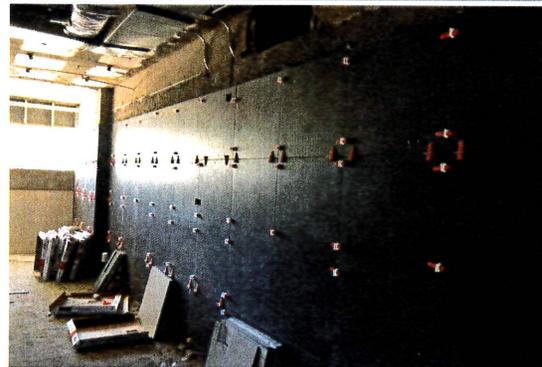

F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
