



Ciudad Juárez, Chih., a 7 de enero 2020.
Oficio No 10 – Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (diciembre) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de diciembre del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

**“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”**

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Diciembre_2019
 FECHA DE CORTE: 31/12/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado

Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36

Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Cargo: Director General de Servicios Administrativos

Teléfono: (656) 688-21-40

Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/equipo				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguro?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	X			\$ 17,268,254.09	\$ 17,268,254.09	\$ -	Aulas	16	1063.17	Trabajos de jardinería en obra exterior, fabricación de escalera de emergencia, herrería, instalación de cancelería interior y exterior, colocación de puertas de carpintería, muebles sanitarios, manijas metálicas para baños, Zda mano de pintura interior y exterior, instalación de cerámica en pisos de audiovisual, limpieza gruesa y fina.	n/a	100.00%	14-06-19	30-12-19	La obra se encuentra en proceso de cierre de administrativo. NOTA: a la fecha se ha pagado un total de \$19,089,211.79 M.N. de los cuales \$17,268,254.09 M.N. corresponden al FAM						
							Auditorio	1	120.00													
							Oficinas académicas	4	200.00													
							Oficinas administrativas	3	150.00													
							Sanitarios	2	150.00													
							Áreas comunes	2	350.00													
							TOTAL	28	2033.17													
					\$17,268,254.09	\$17,268,254.09	\$0.00															

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
 Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES


REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**




100

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

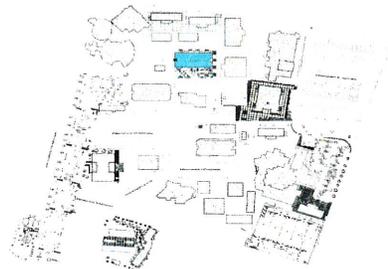

Planta de Conjunto

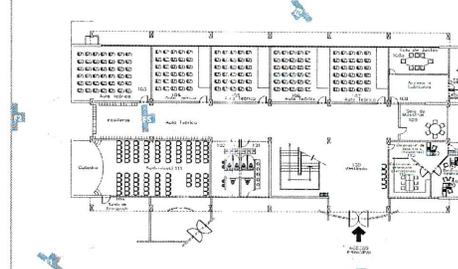


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamin Franklin 4651

FOTOS

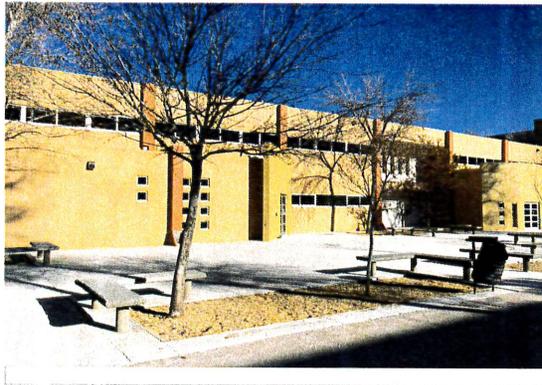


F1: Fachada principal

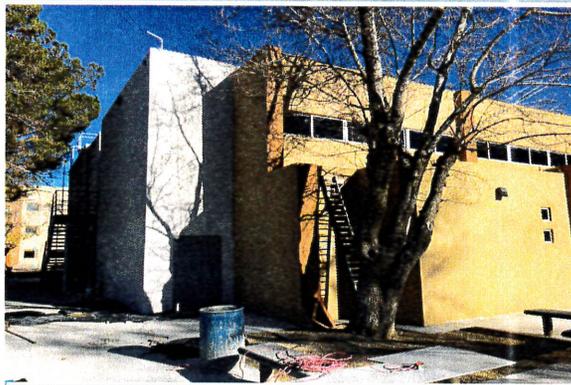

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en jardinería de obra exterior, fabricación de escalera de emergencia, herrería, instalación de cancelería interior y exterior, colocación de puertas de carpintería, muebles sanitarios, mamparas para baños, 2da mano de pintura interior y exterior, instalación de cerámica en pisos de audiovisual, limpieza gruesa y fina.

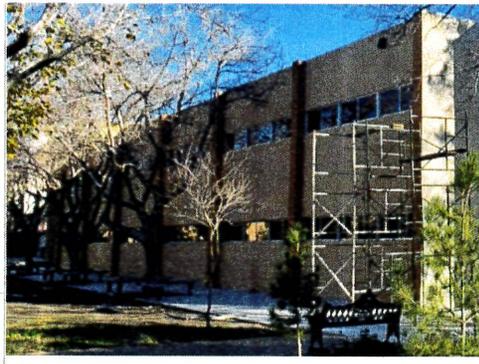

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
