



Ciudad Juárez, Chih., a 1 de agosto de 2019.
Oficio No. 226– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (julio) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de julio del 2019.

La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”



Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado

Julio_2019

FECHA DE CORTE: 31/07/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B



RESPONSABLES

Planeación
 Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado
 Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36
 Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento
 Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Cargo: Director General de Servicios Administrativos
 Teléfono: (656) 688-21-40
 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	x				\$ 17,268,254.09	\$ 8,581,594.34	\$ 8,686,659.75	Aulas	16	1063.17	Se han continuado con los trabajos de demolición en algunas partes del interior del edificio, y se ha iniciado con la preparación de los firmes de concreto, instalación de ductos de clima, instalación eléctrica y muros de tablaroca.	• Se dará seguimiento a las instalaciones eléctricas, así como las instalaciones hidrosanitarias, para seguir con los acabados en pisos y muros durante el mes de agosto.	14.1	14-06-19	15/12/2019	S/O						
Auditorio	1	120.00																					
Oficinas académicas	4	200.00																					
Oficinas administrativas	3	150.00																					
Sanitarios	2	150.00																					
Áreas comunes	2	350.00																					
TOTAL	28	2033.17																					
						\$17,268,254.09	\$8,581,594.34	\$8,686,659.75															


Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES


Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)




Porcentaje de avance

14.1

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

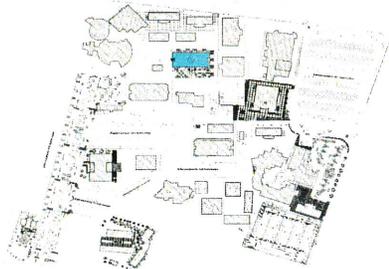

Planta de Conjunto

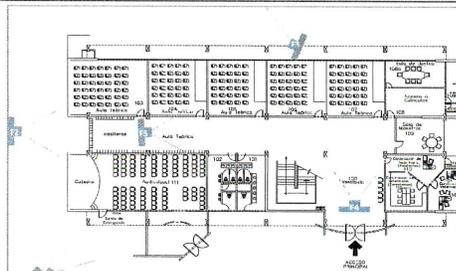


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651

FOTOS

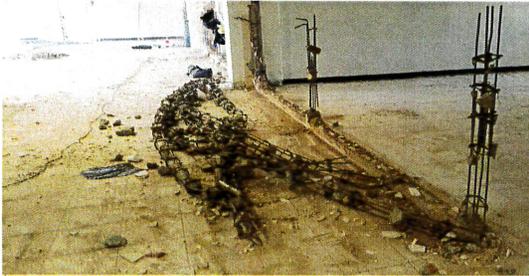

F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos que se llevan a cabo se han diversificado, permitiendo el avance de la obra .



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula 1

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nasear
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
