



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de abril 2023
Oficio núm. 131/2023 Rectoría
Asunto: Entrega informe trimestral
FAM 2021,2022 y 2023
(1er. trimestre 2023)

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
P r e s e n t e. –

En atención a los oficios No. 511/2023-0826-13 y No. 511/2023-0913-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo los Informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, 2022 y 2023 correspondientes al primer trimestre.

Las versiones electrónicas de los citados informes han sido remitidas previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx
- eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

A t e n t a m e n t e

**Por una vida científica
por una ciencia vital**


MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.
Mtra. María Esther Mears Delgado. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional.
Archivo.
DGPDI/SPO/*liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
1^{er} Trim 2023
Número de Cuenta: 31723057

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa: Chihuahua
Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 688-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA


Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejecutado	Reintegr. (TESOFE)	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacio físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Factores		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	OBRA CONCLUIDA				
							Especie/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			Si ya fue inaugurada	Cuenta con Actas			
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	X	\$ 24,756,040.65	\$ 21,126,220.34	\$ 3,629,820.00	\$ 0.31				En este periodo se continuaron los trabajos de: Muros perimetrales planta alta, muros tablaroca interiores, planta alta, colocación de piso cerámico planta alta y muros de: de baños, salidas de contactos y apagadores, clima, luminarias y cancelería perimetral e interior, gabinetes de tableros eléctricos, escalerilla de voz y datos, instalaciones hidrosanitarias.	Están pendientes de realizar los trabajos de Impermeabilización, clima, luminarias y elevador.	80.00%	18/09/21	27/02/23	El día 7 de septiembre de 2022 se reintegró a la TESOFE el remanente del FAM 2021 por un importe de \$3,629,820.00. En el informe anterior se había notificado a la empresa el inicio de proceso de rescisión de contrato, a lo cual se llegó a un acuerdo conciliatorio el día 28 de noviembre del 2022, quedando establecido en el acta de audiencia de conciliación UACJ-CG-AACONCI-001-2022/ UACJ-CG-PROC-CONCI-001-2022 la continuación del contrato y reinicio de los trabajos por realizar el día 5 de diciembre del presente. La fecha de término se estableció para dentro de 12 semanas a partir del reinicio de los trabajos.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			\$24,756,040.65	\$21,126,220.34	\$3,629,820.00	\$0.31															

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: **1** Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración**

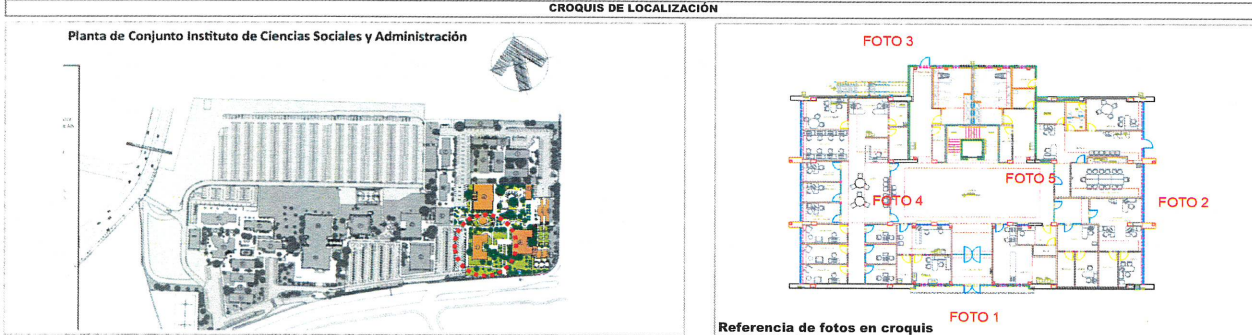

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio F, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300

30%

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Muros perimetrales planta alta, muros de tablaroca interiores planta alta, colocación de piso cerámico planta baja y muros de baños, salidas de contactos y apagadores, cancelería perimetral e interior, gabinetes de tableros eléctricos, escalerilla de voz y datos, compra de unidades de clima, luminarias y elevador.



F3: Azotea

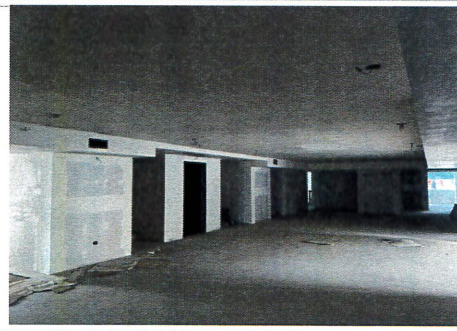

F4: Interior



F5: Aula

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
