



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 06 de octubre 2021

Oficio núm. 294/21 Rectoría

Asunto: Informe trimestral FAM 2021

(3er. trimestre 2021)

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**P r e s e n t e.-**

Estimado Dr. Elizarraraz:

En atención al oficio No. 511/2020.- 0504-12, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, correspondiente al tercer trimestre del 2021.

La versión electrónica del citado informe ha sido remitida previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**A t e n t a m e n t e**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**

**MTR. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
**Rector**

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.

Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias. Contralor General.

Archivo.

DGPDI/SPO/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2021

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3<sup>er</sup> Trim 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

### REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

#### DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 011: 08MSU0245B-114

#### RESPONSABLES

#### Planeación

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado

Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36

Correo electrónico: mmears@uacj.mx

#### Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Cargo: Director General de Servicios Administrativos

Teléfono: (656) 688-21-40

Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

#### DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

#### OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Ramanento	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas						
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	X				\$ 24,756,040.65	\$ 7,371,731.87	\$ 17,384,308.78	Aulas	7	788.02	Se han realizado los trabajos preliminares que incluyen: retiro de muebles sanitarios, rejas, cancelería, lámparas e instalaciones eléctricas de voz y datos, gas, hidráulicas, puertas, demolición de: muros de tabla rosa, de ladrillo, losas de concreto, pisos de mármol, firmes de concreto, banquetas, impermeabilización.	Se tiene contemplado iniciar a la brevedad con los trabajos de: excavaciones, habilitación de acero de refuerzo, cimbrado y colado de concreto de la cimentación, colocación de anclas para estructuras metálicas, rodapiés de block, dalas desplante, habilitación y montaje de estructura metálica.	2.00%	18-09-21	15-05-22	En este periodo se ejecuta la partida: condiciones existentes, el cual considera los trabajos preliminares. El monto ejercido corresponde al anticipo y se ha realizado con recurso propio, debido que a la fecha no ha sido ministrado el recurso financiero por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Oficinas académicas	11	453.25																							
Oficinas administrativas	9	220.20																							
Sanitarios	5	88.54																							
Áreas comunes	15	328.90																							
									TOTAL		1878.97														
						\$24,756,040.65	\$7,371,731.87	\$17,384,308.78																	

  
Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES

  
Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

<sup>1</sup> Se detallaran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.

<sup>2</sup> En esta sección se detallara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3<sup>er</sup> Trim 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

## REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1 Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio D del Instituto de Ingeniería y Tecnología**



Escudo de la Universidad

Porcentaje de avance

2%

## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Planta de Conjunto Instituto de Ciencias Sociales y Administración

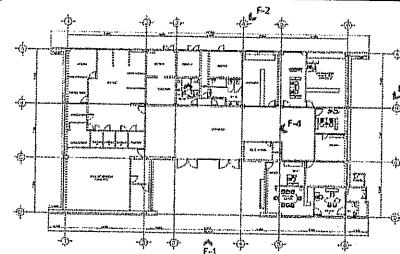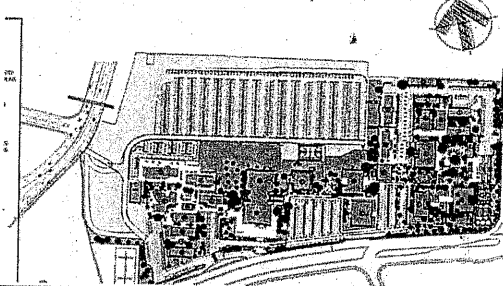

Referencia de fotos en croquis

PLANTA F - INSPECCIONA LA D.M.

## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio F, Campus ICSA, UACJ, Av.  
Universidad y Av. Heroico Colegio Militar  
S/N Zona Chamizal C.P. 32300

## FOTOS

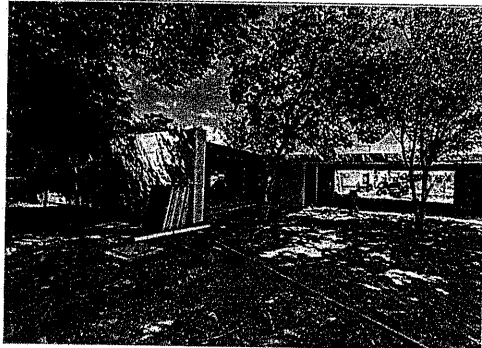


Foto 1: Fachada principal




Foto 2: Interior

## Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de: muebles sanitarios, rejas, cancelería, lámparas e instalaciones eléctricas de voz y datos, gas, hidráulicas, puertas, demolición de: muros de tablaroca, de ladrillo, losas de concreto, pisos de mármol, firmes de concreto, banquetas, impermeabilización.



Foto 3: Interior



Foto 4: Interior




Foto 5: Exterior

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
