



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de abril 2022  
Oficio núm. 126/22 Rectoría  
Asunto: Informe trimestral FAM 2021 y 2022  
(1er. trimestre 2022)

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**Presente.-**

En atención al oficio No. 511/2022-0826-13 le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 y 2022, correspondiente al primer trimestre del 2022.

La versión electrónica del citado informe ha sido remitida previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**Atentamente**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**

**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
**Rector**

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.  
Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias. Contralor General.  
Archivo.  
DGPD/SPO/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado:  
**1<sup>er</sup> Trim 2022**  
FECHA DE EJECUCIÓN: 2/10/2022

**REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114

**RESPONSABLES**

**Planeación**  
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**  
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
Teléfono: (656) 688-21-40  
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Ejercicio	Cuenta de Gastos	Cuenta de Ingresos	Reservaciones	Monto que se va a utilizar en el periodo de ejecución del proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
				Programado	Utilizado	Requerido				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo inauguró?	Entrega Recepción (Acta Inqueto)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	X	\$ 24,756,040.65	\$ 21,126,220.34	\$ 3,629,820.31	Aulas	6	514.99						En este periodo se ejecutan las partidas: estructura de concreto, Albañilería, muros y plafones, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, clima.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
					Oficinas académicas	12	443.68	Durante este periodo se cubrieron los trabajos correspondientes a										
					Oficinas administrativas	9	330.57	albañilería, como son:										
					Sanitarios	4	66.84	colocación de muro de										
					Áreas comunes	15	417.35	block, firmes de concreto, Colocación de vigas aplastadas de concreto y metálicas y yeso, colocación de metalosa en azotes, columnas y vigas metálicas, muros perimetrales: metalosa, así como de planta alta, colocación de muros de muros interiores de panel de yeso. Otros panel de yeso en trabajos incluyeron: planta alta, instalaciones hidrosanitarias, salidas para tomas eléctricas y de alumbrado, fabricación e instalación de ductería de clima.	65.00%	18-09-21	15-05-22							
<b>TOTAL</b>		<b>1773.43</b>																

\$24,756,040.65      \$21,126,220.34      \$3,629,820.31

*J. I. Camargo Nassar*

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar  
Nombre y firma del Titular de la IES

*Gerardo Sandoval Montes*

Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1 Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Planta de Conjunto Instituto de Ciencias Sociales y Administración


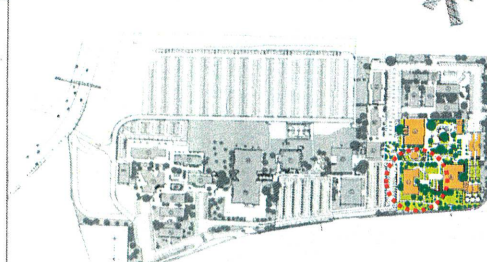


FOTO 3




Referencia de fotos en croquis FOTO 1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Edificio F, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300



FOTOS

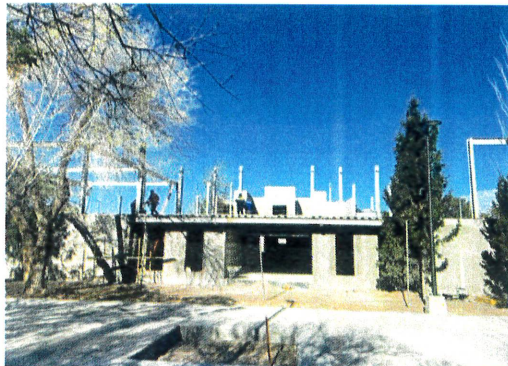


F1: Fachada principal

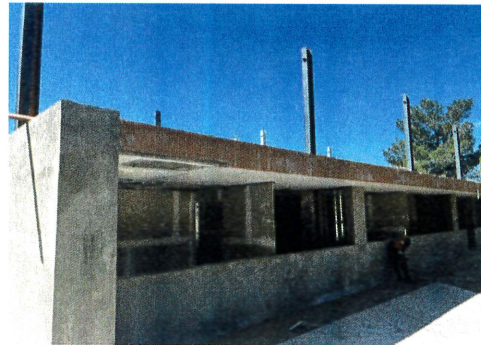

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Muro de block, firmes de concreto, aplanados de concreto y yeso, columnas y vigas metálicas, metalosa, instalaciones hidrosanitarias, muros de panel de yeso, salidas eléctricas y de alumbrado, ductos de clima.

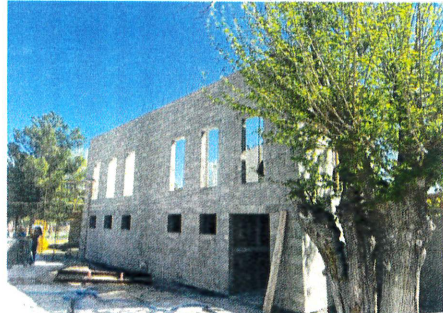

F3: Azotea



F4: Interior



F5: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
