



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de enero 2023
Oficio núm. 01/23 Rectoría
Asunto: Informe trimestral FAM 2021
Y 2022 (4^{to} trimestre 2022)

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
P r e s e n t e . -

En atención al oficio No. 511/2022-0826-13 recibido en esta institución se hace entrega a la Dirección a su digno cargo de los informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 y 2022, correspondientes al cuarto trimestre del 2022.

La versión electrónica de los citados informes han sido remitidas a las siguientes direcciones electrónicas:

- eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx
- dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

A t e n t a m e n t e

**Por una vida científica
por una ciencia vital**

MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.
Mtro. Hernán de Montserrat Herrera Sías, Contralor General.
Archivo.
DGPDI/SPO/*Liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
4^o Trim 2022
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Cargo: Director General de Servicios Administrativos
Teléfono: (656) 688-21-40
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Reintegro (TESOFE)	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹		Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada								
							Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas							
																	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa			
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	x	\$ 24,756,040.65	\$ 21,126,220.34	\$ 3,629,820.00	\$ 0.31	Aulas 6 514.99	Oficinas académicas 12 443.68	Oficinas administrativas 9 330.57	Sanitarios 4 66.84	Áreas comunes 15 417.35	TOTAL 1773.43	En este periodo se continuaron los trabajos de: Muros perimetrales planta alta, muros tablaroca interiores planta alta, colocación de piso, cerámico planta alta y muros de: de baños, salidas de Impermeabilización, contactos y apagadores, clima, luminarias y cancelería perimetral del elevador. interior, gabinetes de: tableros eléctricos, escalerilla de voz y datos, instalaciones: hidrosanitarias.	Están pendientes de realizar los trabajos de: Impermeabilización, clima, luminarias y cancelería perimetral del elevador.	80.00%	18-09-21	27-02-23	El día 7 de septiembre de 2022 se reintegró a la TESOFE el remanente del FAM 2021 por un importe de \$3,629,820.00. En el informe anterior se había notificado a la empresa el inicio de proceso de revisión de contrato, a lo cual se llegó a un acuerdo conciliatorio el día 28 de noviembre del 2022, quedando establecido en el acta de audiencia de conciliación UACJ-CG-AACONCI-001-2022/ UACJ-CG-PROC-CONCI-001-2022 la continuación del contrato y reinicio de los trabajos por realizar el día 5 de diciembre del presente. La fecha de término se estableció para dentro de 12 semanas a partir del reinicio de los trabajos.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			\$24,756,040.65	\$21,126,220.34	\$3,629,820.00	\$0.31																		

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración**




Porcentaje de avance

30%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Planta de Conjunto Instituto de Ciencias Sociales y Administración

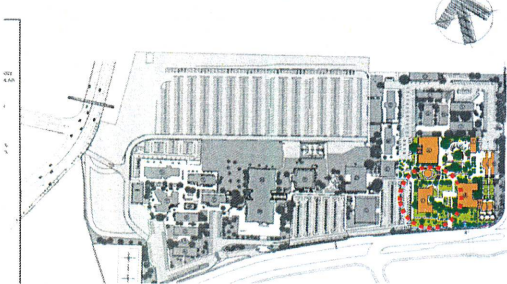

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio F, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300

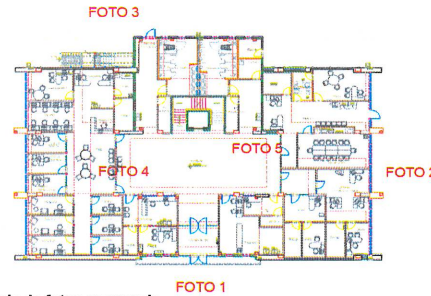

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:


Muros perimetrales planta alta, muros de tablaroca interiores planta alta, colocación de piso cerámico planta baja y muros de baños, salidas de contactos y apagadores, cancelería perimetral e interior, gabinetes de tableros eléctricos, escalerilla de voz y datos, compra de unidades de clima, luminarias y elevador.



F3: Azotea

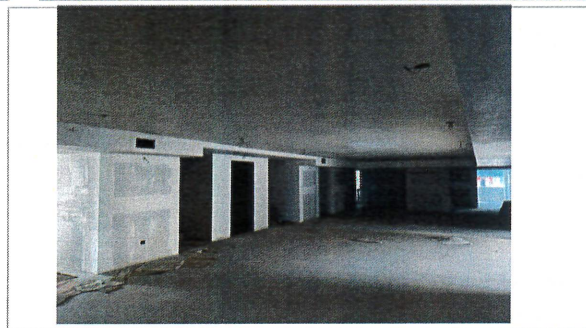

F4: Interior

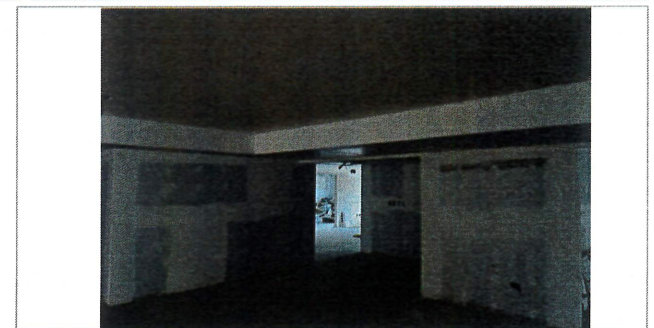

F5: Aula

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
