

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**2<sup>do</sup> Trim 2022**  
FECHA DE CORTE: Junio 2022

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSUQ245B-114



RESPONSABLES

**Planeación**  
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**  
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
Teléfono: (656) 688-21-40  
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Tipo de proyecto	Monto asignado	Monto operado	Monto pendiente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
				Cuadrados	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Inquieto)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1 Construcción de Edificio Multifuncional Campus ICSA en X	\$ 22,894,889.00	\$ 7,527,192.82	\$ 15,367,696.18	Áreas Académicas	25	252.87	n/a	Inicio de los trabajos de obra	0.00%	30-06-22	06-03-23	Obra adjudicada en proceso de inicio de los trabajos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
				Áreas Comunes	21	454.37												
				Aulas	3	176.25												
				Laboratorios	3	120.37												
				Oficinas Académicas	6	83.14												
				Oficinas Administrativas	10	177.78												
				Sanitarios	4	76.68												
<b>TOTAL</b>					<b>1321.45</b>													
	\$22,894,889.00	\$7,527,192.82	\$15,367,696.18															

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES



**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



1 Nombre de la obra: **Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

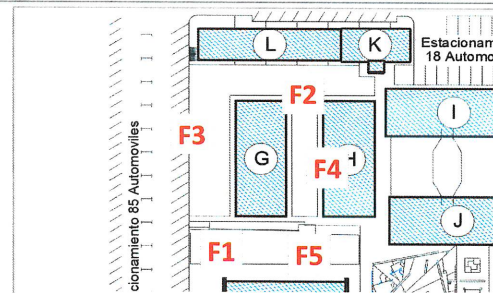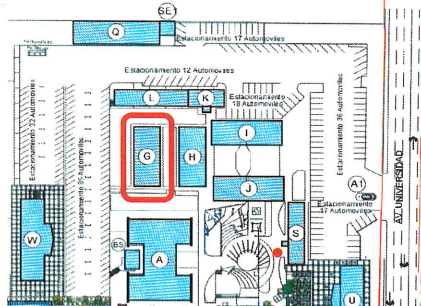

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio G, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


El edificio se encuentra en proceso de inicio de los trabajos preliminares



F3: Azotea

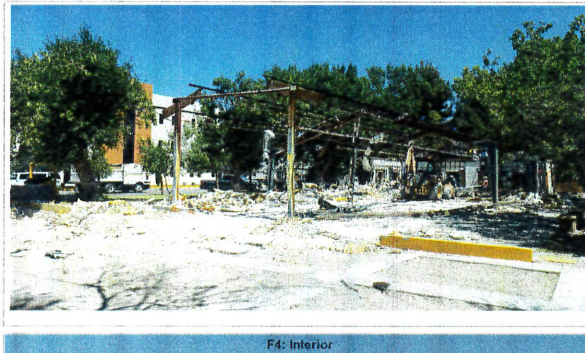

F4: Interior

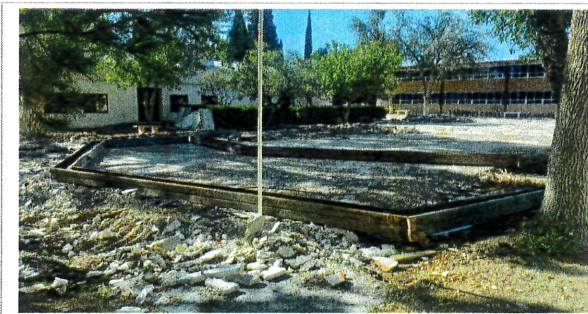

F5: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
