



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 07 de julio 2023  
Oficio núm. 440/23 Rectoría  
Asunto: Entrega informes trimestrales  
FAM 2021, 2022 y 2023  
(2do. trimestre 2023)

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
**P r e s e n t e . -**

En atención al oficio No. 511/2023-0913-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo, los Informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicios 2021, 2022 y 2023 correspondientes al segundo trimestre del presente.

Las versiones electrónicas de los citados informes han sido remitidas previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- [dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx](mailto:dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx)
- [eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx](mailto:eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx)
- [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx)
- [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**A t e n t a m e n t e**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**

  
**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.  
Mtra. María Esther Mears Delgado. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional.  
Archivo.  
DGPDI/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • C. P. 32310 • A. P. 100 • Ciudad Juárez, Chih., México  
Teléfonos: 656 688 2110 y 656 688 2111 • Fax: 656 688 2118 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas, 79994

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**2<sup>do</sup> Trim 2023**

**REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

**Planeación**  
 Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
 Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
 Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**  
 Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
 Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
 Teléfono: (656) 688-21-40  
 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Folio	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Restante	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	Evaluación de los resultados (Costos)	Si ya fue inaugurada				
						Espacios tipo	Cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			Cuenta con Actas				
																Acta de Inauguración	Acta de Entrega	Acta de Recepción	Acta de Entrega	Acta de Recepción
1	Construcción de Edificio Multifuncional Campus ICSA	en x	\$ 22,894,889.00	\$ 22,894,889.00	\$ -	Áreas Académicas	25	252.87			100.00%	23-06-22	26-02-23	Se adjunta acta finiquito.	SI	NO	NO	SI	NO	NO
						Áreas Comunes	21	454.37												
						Aulas	3	176.25												
						Laboratorios	3	120.37												
						Oficinas Académicas	6	83.14												
						Oficinas Administrativas	10	177.78	Cierre administrativo	Ninguna										
						Sanitarios	4	76.68												
						<b>TOTAL</b>		<b>1321.45</b>												
			\$22,894,889.00	\$22,894,889.00	\$0.00															

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
 Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


100%

PRIOIRIDAD


1

Nombre de la obra: **Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

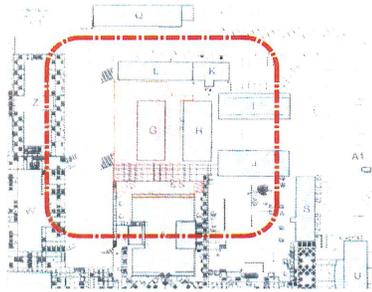

Referencia de fotos en croquis

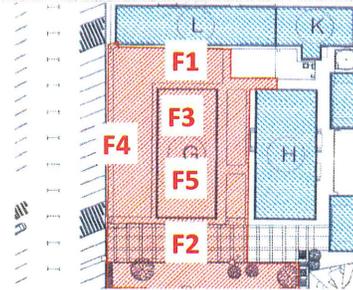

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio G, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Cierre administrativo



F3: Azólea

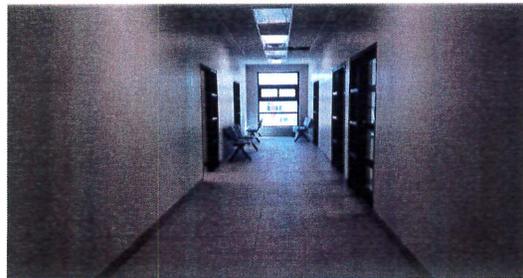

F4: Interior



F5: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**

Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
