



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de octubre 2022

Oficio núm. 554/22 Rectoría

Asunto: Informe trimestral FAM 2021  
y 2022 (3<sup>er</sup> trimestre 2022)

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**Presente.**

En atención al oficio No. 511/2022-0826-13 le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 y 2022, correspondiente al tercer trimestre del 2022

La versión electrónica del citado informe ha sido remitida a las siguientes direcciones electrónicas:

- eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx
- dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**Atentamente**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**



**MTR. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
**Rector**

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.  
Mtra. María Esther Mears Delgado. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional.  
Mtro. Gerardo Sandoval Montes. Director General de Servicios Administrativos.  
Mtro. Hernán de Montserrat Herrera Sías. Contralor General.  
Archivo.

DGPD/SPD/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado  
**3<sup>er</sup> Trim 2022**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

**Planeación**

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
Teléfono: (656) 688-21-40  
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avanza	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
						Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de Edificio Multifuncional Campus ICSA en x	Otra de continuidad Equipamiento Adecuaciones y mejoras Mantenimiento Proyecto sustentable	\$ 22,894,889.00	\$ 18,186,494.61	\$ 4,708,394.39	Áreas Académicas	25	252.87	Durante el trimestre se realizaron los trabajos de cimentación, colocación de estructura metálica, muros perimetrales de bloque, colado de firme, compra de unidades de clima, luminarias, tableros eléctricos y elevador.	Se trabajará en el colado de losas, muros interiores, acabados, vidrios y cancelles, instalaciones hidrosanitarias, gas, comunicación, eléctricas e impermeabilización.	55.00%	23/06/22	28/01/23	El monto ejercido incluye el anticipo del 30% para el inicio de los trabajos, dentro del porcentaje de avance se incluye la compra de suministros.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
						Áreas Comunes	21	454.37												
						Aulas	3	176.25												
						Laboratorios	3	120.37												
						Oficinas Académicas	6	63.14												
						Oficinas Administrativas	10	177.78												
						Sanitarios	4	76.68												
						<b>TOTAL</b>		<b>1321.45</b>												

\$22,894,889.00    \$18,186,494.61    \$4,708,394.39

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES





REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

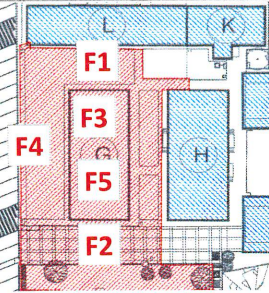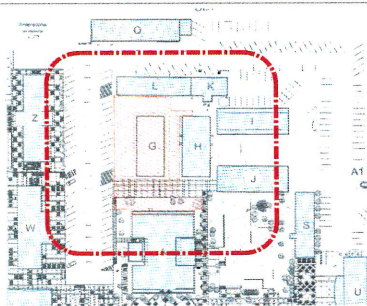

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio G, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N  
Zona Chamizal C.P. 32300



Porcentaje de avance

55%

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Azotea



F4: Interior

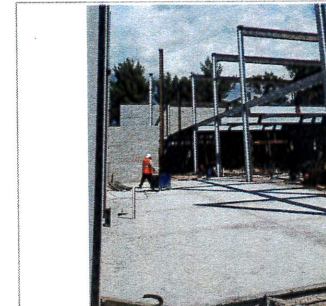

F5: Aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se continuo con los trabajos de cimentación, estructura metálica, muros perimetrales de bloque, colado de firme, asimismo se realizó la compra de unidades de clima, luminarias, tableros eléctricos y elevador, dado que los tiempos de entrega han aumentado.

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
