



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de abril 2023
Oficio núm. 131/2023 Rectoría
Asunto: Entrega informe trimestral
FAM 2021,2022 y 2023
(1er. trimestre 2023)

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
P r e s e n t e. –

En atención a los oficios No. 511/2023-0826-13 y No. 511/2023-0913-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo los Informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021, 2022 y 2023 correspondientes al primer trimestre.


Las versiones electrónicas de los citados informes han sido remitidas previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx
- eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

A t e n t a m e n t e

**Por una vida científica
por una ciencia vital**


MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.
Mtra. María Esther Mears Delgado. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional.
Archivo.
DGPDI/SPO/*liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
1er Trim 2023
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa: Chihuahua
Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 688-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto <small>Quinta, Termino, Ase Equipamiento Zonas comunes y parques Manutención Proyectos de accesibilidad</small>	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA					
						Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas					
													Inicio		Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Adecuaciones y Mejoras de Edificios "X" y "Y" de Campus ICB		\$ 24,225,308.00	\$ -	\$ 24,225,308.00	Laboratorios	12	302.27	n/a	n/a	0.00%	15/07/23	31/12/23	En este periodo se trabaja en adecuaciones del proyecto ejecutivo, así como en la preparación de las bases licitatorias.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			\$24,225,308.00	\$0.00	\$24,225,308.00	Sanitarios	6	148.35												
						Áreas comunes	41	1160.55												
						Aulas	2	33.62												
						Clinicas y simulación	4	851.44												
						Sala de usos múltiples	1	159.76												
						Otros	11	163.85												
						TOTAL		2819.84												

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL





PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras de Edificios "X" y "Y" de Campus ICB**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

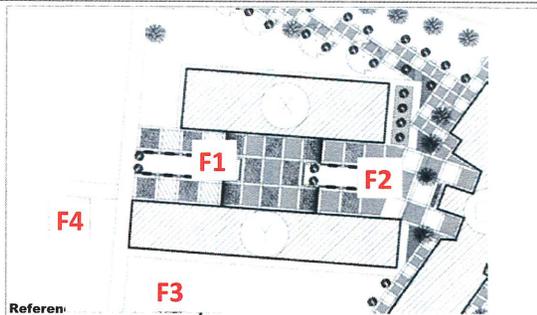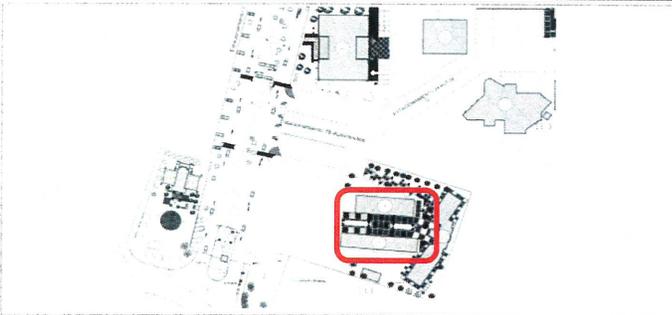

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio X y Y, Campus ICB, UACJ, Av. Benjamín Franklin no. 4650 Zona PRONAF C.P. 32315, Ciudad Juárez, Chih. México.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Azotea



F4: Interior



F5: Aula

Comentarios de los trabajos realizados:

El edificio se encuentra sin modificaciones aún, dado que se esta preparando la licitación pública de la obra.

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
