



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 07 de julio 2023  
Oficio núm. 440/23 Rectoría  
Asunto: Entrega informes trimestrales  
FAM 2021,2022 y 2023  
(2do. trimestre 2023)

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
**P r e s e n t e . –**

En atención al oficio No. 511/2023-0913-13, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo, los Informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicios 2021, 2022 y 2023 correspondientes al segundo trimestre del presente.

Las versiones electrónicas de los citados informes han sido remitidas previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- [dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx](mailto:dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx)
- [eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx](mailto:eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx)
- [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx)
- [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**A t e n t a m e n t e**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**

  
**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.  
Mtra. María Esther Mears Delgado. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional.  
Archivo.  
DGPDI/\*liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • C. P. 32310 • A. P. 100 • Ciudad Juárez, Chih., México  
Teléfonos: 656 688 2110 y 656 688 2111 • Fax: 656 688 2118 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas, 79994

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Bimestre reportado:  
2do Trim 2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
Teléfono: (656) 688-21-40  
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Ejercicio	Número del proyecto	Tipo de proyecto Obras de infraestructura Equipamiento Adecuaciones y mejoras Mantenimiento Proyecto de investigación	Monto autorizado	Monto ejercido	Reintegro (TESOFE)	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados, y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustenten el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	OBRA CONCLUIDA								
							Especialización	Cantidad	metros cuadrados				Acciones que sustenten el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar		% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Si ya fue inaugurada	Cuenta con Actas				
																	Inicio	Termino		Si ya fue inaugurada	Actas de entrega de obra	Actas de entrega de obra	Actas de entrega de obra	Actas de entrega de obra
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	X	\$ 24,756,040.65	\$ 21,126,220.34	\$ 3,629,820.00	\$ 0.31	Aulas 12 Oficinas académicas 9 Oficinas administrativas 4 Sanitarios 15 Áreas comunes	6 12 9 4 15	514.99 443.68 330.57 66.84 417.35	En proceso de rescisión de contrato y nueva adjudicación para concluir la obra con recursos propios.	Las acciones pertinentes para la conclusión de la obra	62.97%	18-09-21	27-02-23					Si	Actas	Actas	Actas	Actas	Actas
			\$24,756,040.65	\$21,126,220.34	\$3,629,820.00	\$0.31	TOTAL		1773.43															

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



PROYECTO

1

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Planta de Conjunto Instituto de Ciencias Sociales y Administración

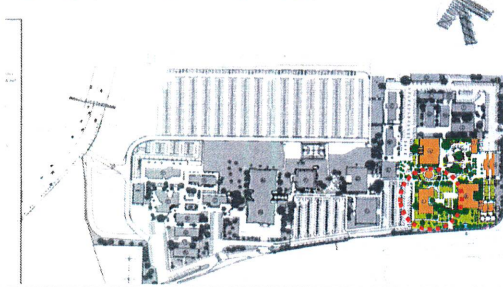


FOTO 3




FOTO 2

FOTO 1

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio F, Campus ICESA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N  
Zona Chamizal C.P. 32300

63%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En este trimestre no se realizaron actividades.



F3: Azotea



F4: Interior



F5: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**

Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
