



Ciudad Juárez, Chihuahua., a 8 de julio 2021
Oficio núm. 192/21 Rectoría
Asunto: Informe trimestral FAM 2021
(2do Trimestre 2021)

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
P r e s e n t e . -

Estimado Dr. Elizarraraz:

En atención al oficio No. 511/2020.- 0504-12, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, correspondiente al segundo trimestre del 2021.

La versión electrónica del citado informe ha sido remitida previamente a las siguientes direcciones electrónicas:

- isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

A t e n t a m e n t e

**Por una vida científica
por una ciencia vital**

MTRÓ. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.
Archivo.
DGPDI/SPO/memd/*liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2021

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Trimestre reportado
2^{do} Trim 2021
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

Planeación
 Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado
 Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36
 Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento
 Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
 Cargo: Director General de Servicios Administrativos
 Teléfono: (656) 688-21-40
 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcances del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Cuenta con Actas | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|----------|---|--|-------------|---------------------|----------|---------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | | Obra de continuidad | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento | | | | Presupuesto sustancial | Espacio/equipo | cantidad | | | | metros cuadrados | Inicio | | | Término | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega-Recepción (Acta Inicial) | Acta Administrativa de Entrega-Recepción |
| 1 | Adecuaciones y Mejoras del Edificio "F" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración | X | | | | \$ 24,756,040.65 | \$ - | \$ 24,756,040.65 | Aulas | 7 | 788.02 | Se tiene el proyecto junto a las bases licitatorias, y se cuenta con el oficio de aprobación del recurso ante Gobierno del Estado de Chihuahua, número 2021-2K017D2-A-8912 de fecha 29 de junio de 2021 | Esta por realizarse el concurso de licitación de la obra | 0.00% | 01-08-21 | 25-02-22 | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oficinas académicas | 11 | 453.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficinas administrativas | 9 | 220.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanitarios | 5 | 88.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas comunes | 15 | 328.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | \$24,756,040.65 | \$0.00 | \$24,756,040.65 | | | | | | | | | | | | | | | |

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
2^{do} Trim 2021
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANSE TRIMESTRAL

1 Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio D del Instituto de Ingeniería y Tecnología**




Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Planta de Conjunto Instituto de Ciencias Sociales y Administración


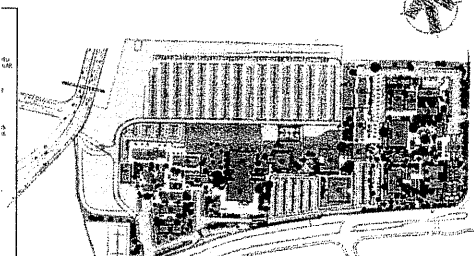


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Edificio F, Campus ICSA, UACJ, Av.
Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N
Zona Chamizal C.P. 32300

FOTOS

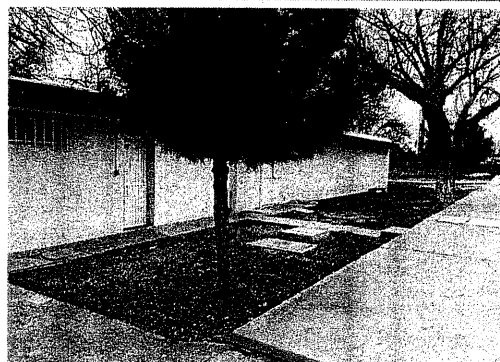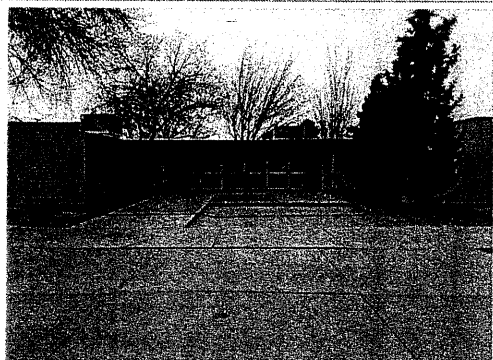

Comentarios de los trabajos realizados:

El edificio se encuentra sin modificaciones aún.

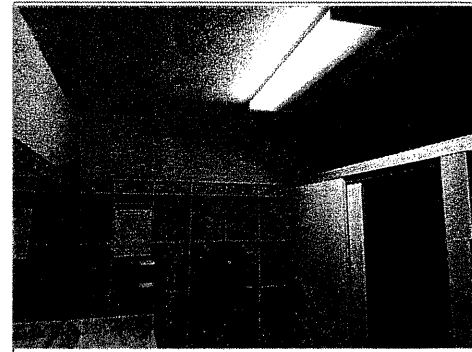

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
