



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de enero 2023  
Oficio núm. 01/23 Rectoría  
Asunto: Informe trimestral FAM 2021  
Y 2022 (4<sup>to</sup> trimestre 2022)

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
**P r e s e n t e . -**

En atención al oficio No. 511/2022-0826-13 recibido en esta institución se hace entrega a la Dirección a su digno cargo de los informes de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 y 2022, correspondientes al cuarto trimestre del 2022.

La versión electrónica de los citados informes han sido remitidas a las siguientes direcciones electrónicas:

- eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx
- rocioc@nube.sep.gob.mx
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx
- dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, me permito reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

**A t e n t a m e n t e**

**Por una vida científica  
por una ciencia vital**

**MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR**  
Rector

C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.  
Mtro. Hernán de Montserrat Herrera Sías, Contralor General.  
Archivo.  
DGPDI/SPO/\*Liba

*Rectoría*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ**

2022

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Trimestre reportado  
**4<sup>to</sup> Trim 2022**  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022

**REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



## RESPONSABLES

**Planeación**

Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado  
 Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36  
 Correo electrónico: mmears@uacj.mx

**Obras y Mantenimiento**

Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes  
 Cargo: Director General de Servicios Administrativos  
 Teléfono: (656) 688-21-40  
 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
						Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de Edificio Multifuncional Campus ICSA	en X	\$ 22,894,889.00	\$ 22,894,889.00	\$ -	Áreas Académicas	25	252.87	Durante el trimestre se realizaron los trabajos de colado de losas, muros interiores de tablaroca, instalaciones eléctricas, loseta de cerámica, sistemas de ductos e instalaciones hidrosanitarias.	Se trabajará en la colocación de puertas de madera, plafón reticular, luminarias, cancelería y pintura exterior e interior..	85.00%	23-06-22	28-01-23	El monto ejercido incluye el anticipo del 30%. El porcentaje de avance incluye la compra de suministros, los trabajos por ejercer serán cubiertos con recursos propios de la UACJ.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Áreas Comunes	21	454.37																		
Aulas	3	176.25																		
Laboratorios	3	120.37																		
Oficinas Académicas	6	63.14																		
Oficinas Administrativas	10	177.78																		
Sanitarios	4	76.68																		
			\$22,894,889.00	\$22,894,889.00	\$0.00	<b>TOTAL</b>		<b>1321.45</b>												

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

85%


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

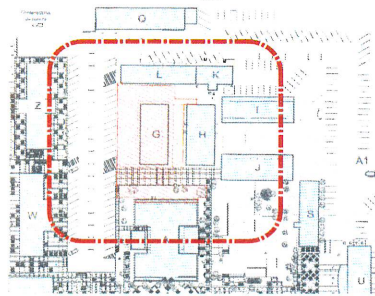

Referencia de fotos en croquis

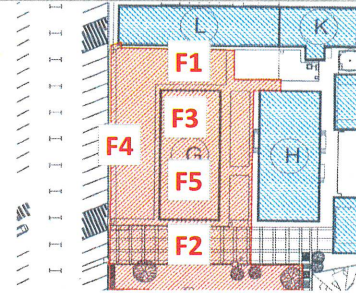

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio G, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Se trabaja en acabados exteriores e interiores. Se colocan sistemas de ductos en ambos niveles, así como en muros divisorios interiores. Se continúa en la colocación de instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias.



F3: Azotea



F4: Interior



F5: Aula

**Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**Mtro. Gerardo Sandoval Montes**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
