INFORME DE AVANCE DE OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAM 2013-14

Diciembre de 2014.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ricardo Duarte Jáquez Rector

Rita Ileana Olivas Lara

Directora General de Servicios Administrativos

Ángel Fernando Gómez Martínez

Director General de Planeación y Desarrollo Institucional


FAM 2013


De acuerdo al Plan Maestro de Construcción en el Marco del Programa Integral (PIFI) 2012-13 se hizo la solicitud para la construcción del Edificio Multifuncional D4 en Ciudad Universitaria.

Esta obra tiene una superficie total de 3,076.00 m² de construcción y un costo de \$43,962,134.25

FAM 2013


Respecto al Edificio Multifuncional D4 en Ciudad Universitaria se tiene un avance de obra que corresponde al 100%. Actualmente se encuentra en proceso de finiquito. El avance financiero refleja el pago del 86% de anticipo y 12 estimaciones.

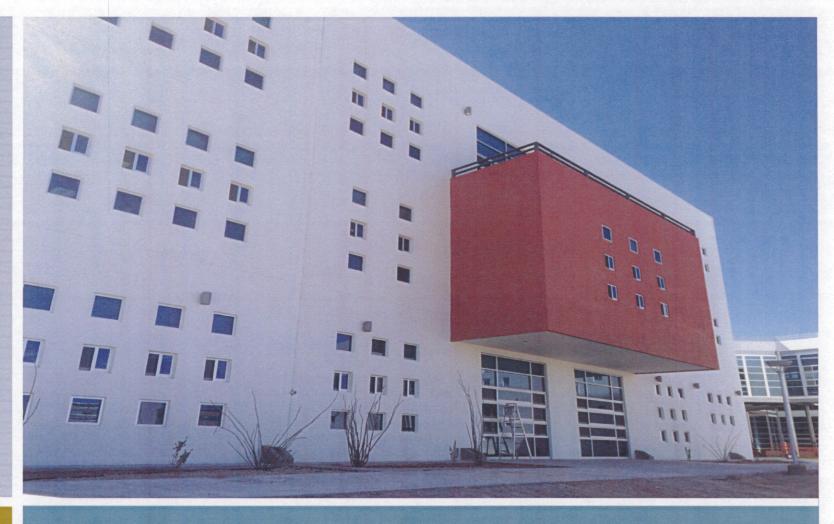

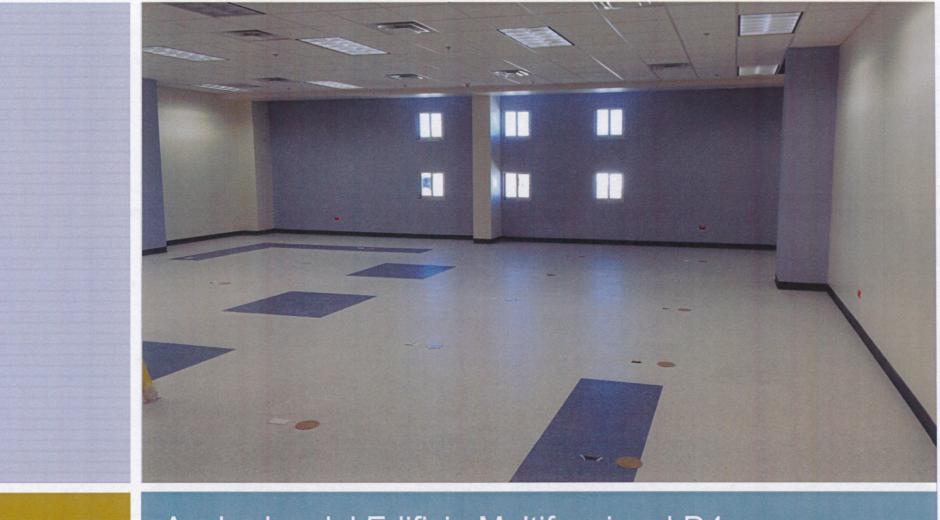


Acabados del Edificio Multifuncional D4.



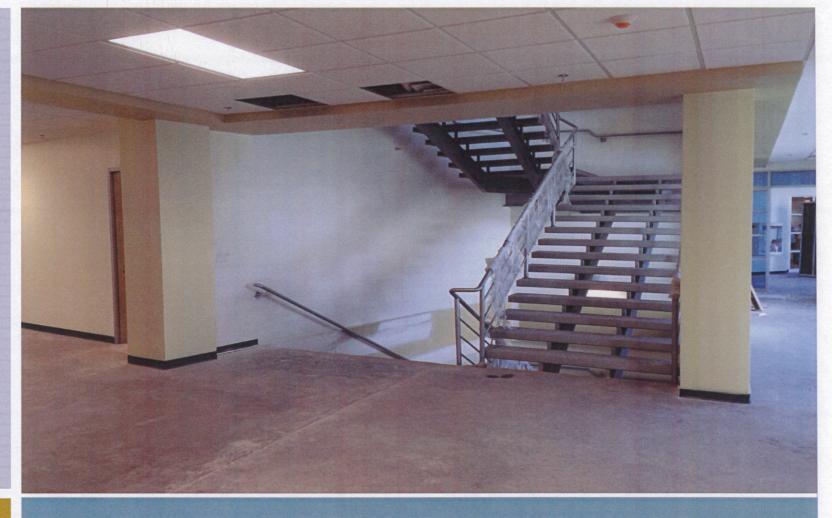



Resumen

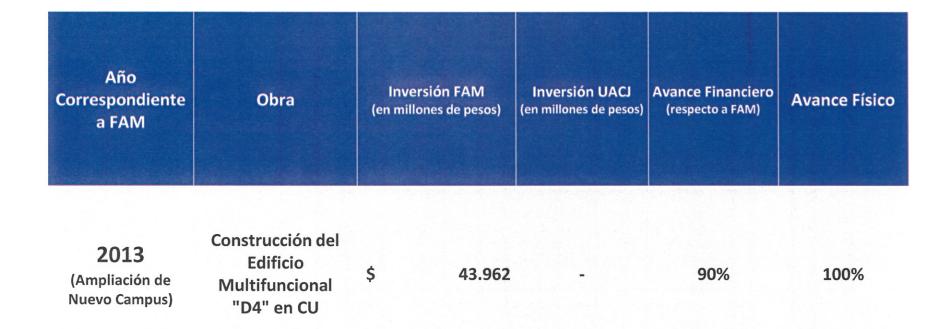

FAM 2014

Respecto a la Construcción del edificio de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y) y del edificio multifuncional E que se encuentra en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, se encuentran en proceso de licitación, El proyecto se reajusto en virtud del monto autorizado.

Resumen

Año Correspondiente a FAM	Obra	Inversión FAM (en millones de pesos)	Inversión UACJ (en millones de pesos)	Avance Financiero (respecto a FAM)	Avance Físico
2014	Construcción del edificio de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	\$ 28,919		0%	0%
2014	Construcción del edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	\$ 20,500		0%	0%

Gracias por su atención.
