

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B-114



RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado
Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36
Correo electrónico: mmears@uacj.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Cargo: Director General de Servicios Administrativos
Teléfono: (656) 688-21-40
Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Código	Descripción del Proyecto	Monto Aprobado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ¹		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
								Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acto físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA	\$ 22,894,899.00	\$ 0.00	\$ 22,894,899.00	n/a	n/a	0.00%	06-06-22	10-02-23	En este periodo se trabaja en adecuaciones del proyecto ejecutivo, así como en la preparación de las bases licitatorias.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
				TOTAL												
		\$22,894,899.00	\$0.00	\$22,894,899.00												


Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



1 Nombre de la obra: **Construcción de Edificio Multifuncional en Campus ICSA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

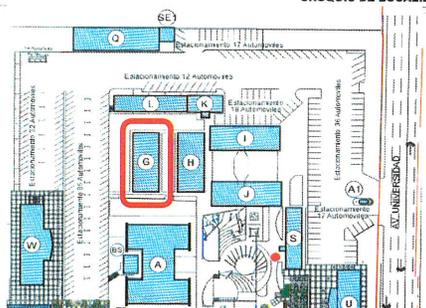

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio G, Campus ICSA, UACJ, Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal C.P. 32300


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Interior

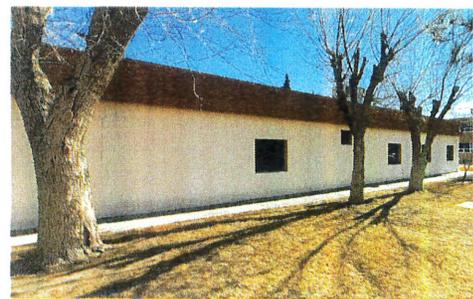

F3: Azotea



F4: Interior



F5: Aula

Comentarios de los trabajos realizados:

El edificio se encuentra sin modificaciones aún, dado que se esta preparando la licitación pública de la obra.

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
