



Cd. Juárez, Chih., a 03 de Diciembre de 2015.
Oficio No. 1126 – Rectoría / Planeación.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Presente.-


Por medio de este conducto reciba un saludo y al mismo tiempo le hacemos llegar los informes de Avance de Obras Apoyadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014, correspondiente al mes de Noviembre del 2015.

Cabe aclarar que la versión electrónica del mencionado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

julieta.nishisawa@sep.gob.mx, rocioc@sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@sep.gob.mx, jcarlosv@sep.gob.mx

Hago el momento propicio para manifestarle la seguridad de mi consideración.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL"



Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Ccp: M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional.
Mtra. María del Rocío Chávez, Subdirectora de Programas de Apoyo.

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Av. Plutarco Elías Calles 1210 • Fovissste Chamizal • Ciudad Juárez, Chih., México • C. P. 32310 • A. P. 100
Teléfonos: (656) 688 21 10 y 688 21 11 • Fax (656) 688 21 18 • P. O. Box 10307 • El Paso, Texas 79994

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa:	Chihuahua
Clavelnst 911	08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS						
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total			Programada
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	-	SI	Doc. en Ciencias Sociales Doc. en Psicología Doc. en Ciencias Administrativas Mtría. en Administración Mtría. en Economía Mtría. en Ciencias Sociales Mtría. en Investigación Educativa Aplicada Mtría. en Estudios Literarios	NO	ProGES Página 10 ProDES ICESA página 6.	Actualmente el ICESA no cuenta con algun edificio específicamente para los posgrados, además el número de programas ha crecido de 7 a 17 en 10 años, lo cual representa un crecimiento tambien en la matrícula que actualmente suma 444.	X	X	266	178	444	271	444	14/12/14
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	Lic. en Educación Lic. en Psicología Industrial Lic. en Trabajo Social Lic. en Enfermería Lic. en Nutrición Lic. en Turismo Lic. en Mercadotecnia Médico Veterinario Zootecnista Ing. en Agronegocios	NO	-	NO	No aparece en el PIFI se incorporó a la base de necesidades en 2014	El rápido crecimiento de este campus en los últimos años demanda mayor cantidad de aulas que permitan atender a los estudiantes con calidad, preservando la acreditación de los programas, en 10 años ha tenido un crecimiento del 1036%	X	X	690	446	1,136	19.00	1,136	05/12/14
TOTAL										956.00	624.00	1,580.00	290.00	1,580.00	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

ClaveInst 911

08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			CALENDARIO DE EJECUCIÓN		SEDE DE LA OBRA							Derr		
	Descripción de la obra	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente		Nuevo Campus	Empleos Ger
		Programada	Programada			Número	Nombre								
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	15/12/15	18/01/16	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU4981J	Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Humanidades	Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	X	-	11,567,652.40	
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	15/11/15	18/01/16	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Gobernador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Nuevo Casas Grandes	50	Nuevo Casas Grandes	08USU4984G	División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes (DES no registrada)	Departamento de Ciencias Administrativas, Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Salud y Departamento de Ciencias Veterinarias	División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes	X	-	8,200,000.00	
TOTAL														19,767,652.40	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

ClaveInst 911

08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		MANTENIMIENTO		CONST																	
	Descripción de la obra	erados	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros d
		Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	96	17,351,478.60			22	597					17	230	1	47							2
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	68	12,300,000.00			5	241	5	274	1	82			1	166	1	17	1	12			
TOTAL		164.90	29,651,478.60			27.00	838.60	5.00	273.96	1.00	81.56	17.00	229.95	1.00	46.67	1.00	166.21	1.00	16.67	1.00	11.69	2.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa:

Chihuahua

Clavelinst 911

08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																			
	Descripción de la obra	DESCRIPCIÓN																		
		M2	Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	
1	Construcción del Edificio de Posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	133									8	384	6	117	20	532	Bodegas Cuarto de Comunicaciones Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo	76.00	2,040	28,919,131.00
2	Construcción del Edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua										5	306	5	75	14	143	Bodegas Cuarto de Comunicaciones Cuarto de Tableros Cuartos de Aseo	38.00	1,315	20,500,000.00
TOTAL		133.05									13.00	689.61	11.00	192.14	34.00	674.44		114.00	3,354.55	49,419,131.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PIFI v. 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
 Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Entidad federativa:
 Chihuahua
 ClaveInst 911
 08MSU0245B

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA							Derrama económica		MANTENIMIENTO									
	Descripción de la obra	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		
			Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.
1	Edificio Multifuncional I1 en el IADA	X	1,390	1,303	2,693	85	2,757	15-08-2015	15-05-2016	23-05-2016	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Governador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Ciudad Juárez	37	Juárez	08USU0013U	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	Departamento de Arquitectura, Departamento de Diseño.	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	No	N/A	8,399,740.80	70	12,599,611.20			7	266	3
2	Edificio D en DM de Cuauhtémoc	X	361	270	631	17.00	631	15-08-2015	15-05-2016	23-05-2016	Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de la República Lic. César Duarte Jáquez Governador Lic. Ricardo Duarte Jáquez Rector	Cd. Cuauhtémoc	17	Cuauhtémoc	08USU4996L	División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura, Departamento de Humanidades, Departamento de Ciencias de la Salud.	División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc	No	N/A	8,000,000.00	67	12,000,000.00			14	641	
TOTAL			1,751.00	1,573.00	3,324.00	102.00	3,388.00														16,399,740.80	136.80	24,599,611.20			21.00	907.16	3.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PIFI v. 2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
 Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Entidad federativa:
 Chihuahua
 Clavelnst 911
 08MSU0245B

Prioridad		CONSTRUCCIÓN																										Totales						
		Aleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2			
1	Edificio Multifuncional I1 en el IADA	233			9	126																		8	469	6	116	10	77	Cuarto de aseo Cuartos de tableros Cuartos de comunicaciones Área de descanso	43.00	1,288	20,999,352.00	
2	Edificio D en DM de Cuauhtémoc																																	
TOTAL		233.20			9.00	125.89																		13.00	876.89	10.00	209.23	20.00	154.79		76.00	2,506.94	40,999,352.00	

**INFORME DE AVANCE DE
OBRAS FINANCIADAS
CON RECURSOS DEL
FAM 2014**

Noviembre del 2015.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rita Ileana Olivas Lara
Directora General de Servicios Administrativos

Ángel Fernando Gómez Martínez
Director General de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Av. Plutarco E. Calles núm. 1210
Fovissste Chamizal, código postal 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional.

FAM 2014



De acuerdo al Plan Maestro de Construcción en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014 se hizo la solicitud para la construcción del edificio de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) edificio Y, y en la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes el edificio E.

Estas obras tienen una superficie total de 3,354.55 m² de construcción y un costo de \$49,419,131.00

FAM 2014



Respecto al Edificio Multifuncional Y en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración se tiene un avance de obra que corresponde al 99%. Actualmente se encuentra en proceso de construcción. Se tiene un avance financiero de 89%, que corresponde al 40% de anticipo mas el pago de 12 estimaciones.



Construcción del edificio Y de posgrado.





Construcción del edificio Y de posgrado.



FAM 2014



Respecto al Edificio Multifuncional E en el Campus de Nuevo Casas Grandes se tiene un avance de obra que corresponde al 100%. Actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo. Se tiene un avance financiero de 91%, que corresponde al 35% de anticipo mas el pago de 20 estimaciones.

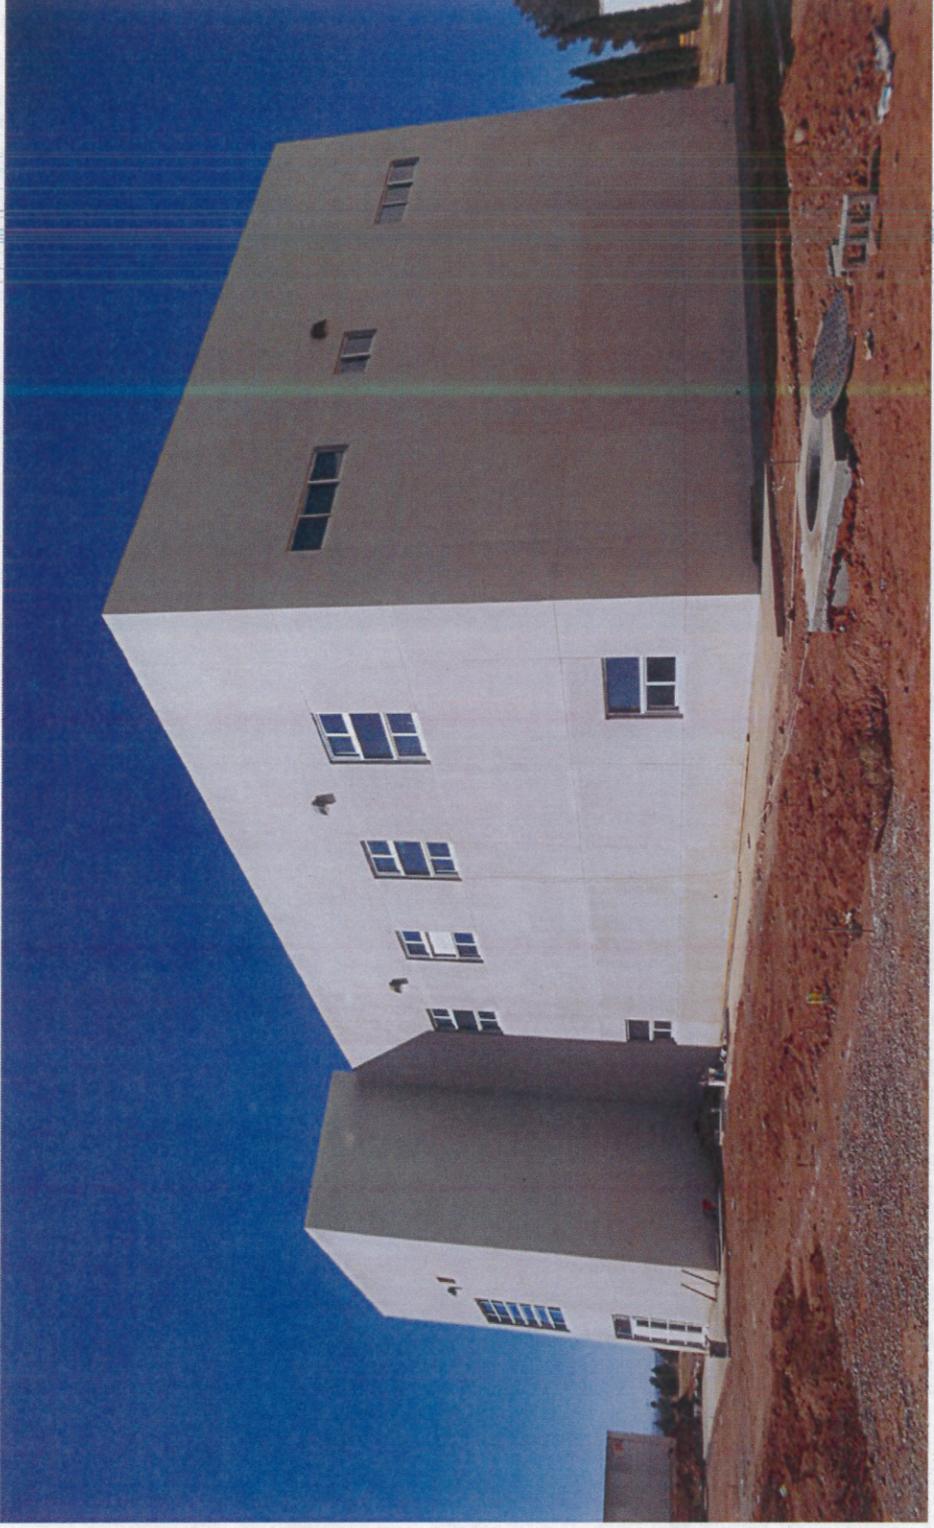

Construcción del edificio multifuncional E.





Construcción del edificio multifuncional E..

Resumen

Año Correspondiente a FAM	Obra	Inversión FAM (en millones de pesos)	Inversión UACJ (en millones de pesos)	Avance Financiero (respecto a FAM)	Avance Físico
2014	Construcción del edificio de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	\$ 28,919	-	89%	99%
2014	Construcción del edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	\$ 20,500	-	91%	100%
2015	Construcción del edificio multifuncional del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (Edificio I1)	\$ 20,999	-	0% (En proceso de licitación)	0% (En proceso de licitación)
2015	Construcción del edificio D en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc, Chihuahua	\$ 20,000	-	0% (En proceso de licitación)	0% (En proceso de licitación)



Gracias por su atención.
