2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE CORTE: 31/08/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Entidad federativa: Chihuahua
Clave Inst 911: 08MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre:	Nombre: Rafael Woo Chew
Cargo:	Cargo: Director de Infraestructura Física
Teléfono:	Teléfono: 656 6883860
Correo electrónico:	Correo electrónico: rwoo@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]: Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	**Ampliación y remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)**			X			$ 8,031,647.00	$ 4,685,127.42	$ 3,346,519.58	Aulas	20	1192.51	Finalización de cableado para alimentaciones electricas a tableros, colocacion de plafones acusticos,pintura en barandales y pasamanos metalicos, colocacion de rejillas de inyeccion y retorno de clima, arranque de equipos de clima, colocacion de luminarias, instalacion y arranque de elevador para discapacitados, colocacion de puertas principales de cancelería interiores y exteriores, construccion de banquetas	n/a	GLOBAL DEL PROYECTO									
										Cubículos	6	50.40												
										Oficinas académicas	2	37.04												
										Oficinas admvas.	2	62.22												
1192.51										Áreas comunes: pasillos, ctn. de aseo y áreas de	12	627.64			100	07/02/18	27/08/18	Obra Finiquitada.						
50.40										Salas de juntas	2	99.48												
37.04										Sanitarios	2	62.46												
62.22										**TOTAL**	**46**	**2131.75**												
627.64																								
	Ampliación y remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)			X			$ 9,000,000.00	$ 5,250,000.00	$ 3,750,000.00	Aulas	16	959.68	Jardineria y limpieza fina.	n/a	100	07/02/18	30/08/18	Obra Finiquitada.						
99.48										Cubículos	5	248.71												
62.46										Oficinas académicas	1	31.19												
										Oficinas admvas.	4	85.52												
										Otros: Sala de juntas y sala de maestros	2	100.61												
										Áreas comunes: pasillos, ctn. de aseo y áreas de	9	407.83												
										Sanitarios	4	62.05												
										TOTAL	**0**	**1895.39**												
							$17,031,647.00	**$9,935,127.42**	**$7,096,519.58**															
2																								

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE CORTE: 31/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Porcentaje de avance
100

PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "B" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

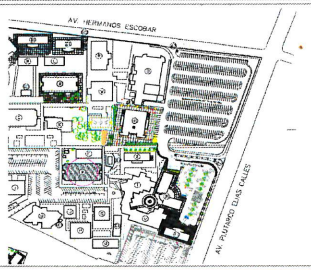



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio B, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamín Franklin 4651

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Jardineria y limpieza fina.



F3: Fachada posterior

F4: Entrada



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE CORTE: 31/08/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Porcentaje de avance
100

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "C" del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

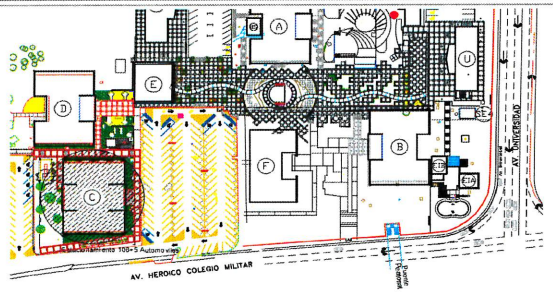



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio C, Campus ICSA, UACJ, Av. Heroico Colegio Militar esquina con Av. Universidad S/N.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Finalizacion de cableado para alimentaciones electricas a tableros, colocacion de plafones acusticos,pintura en barandales y pasamanos metalicos, colocacion de rejillas de inyeccion y retorno de clima, arranque de equipos de clima, colocacion de luminarias, instalacion y arranque de elevador para discapacitados, colocacion de puertas principales de canceleria interiores y exteriores, construccion de banquetas exteriores, colocacion de jardineria en obra exterior, limpieza fina de todo el edificio.

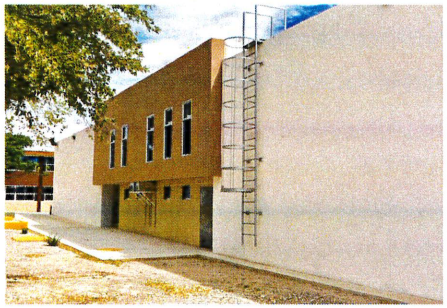

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula 1

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.
